

■事後評価（農山漁村地域整備交付金）

さぬきの土と水と農村づくりプラン（Ⅱ期）

農村整備課

農山漁村地域整備計画

事後評価書

計画の名称	さぬきの土と水と農村づくりプラン(Ⅱ期)
計画策定主体	香川県
対象市町村	高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、多度津町、まんのう町
計画の期間	平成27年度～平成31年度(令和元年度)(5年間)
計画の目標	農業従事者の減少や、高齢化、さらには厳しい農業情勢の中、農家の生産意欲が低下していることから、ため池整備のほか、農地・農道・用排水路などの生産基盤や、農村の生活環境基盤の整備を総合的に実施することにより農業経営の安定と地域の活性化を推進する。

- 1. 事業効果の発現状況**
- ・ほ場整備等の生産基盤の整備により、農地の生産性向上が図られた。
 - ・ため池の整備により、下流の農地、宅地等の被害防止が図られた。

項目	指標	達成値	達成率
① 農業生産基盤整備により、生産性の向上を図る農地面積	239ha	120ha	50%
② 農産物輸送や通作などの効率化に向け整備する農道の路線数	4路線	2路線	50%
③ 老朽ため池の整備により災害の未然防止を図る面積	116ha	86ha	74%
④ 集落排水施設等を整備し、生活環境の維持・改善を図る集落数	11集落	8集落	73%

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	実施 事業量	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	計画期間内 の総事業費 (千円)	進捗 率	費用対効果	備考	
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業(中山間総合(一般型事業))	さぬき南部	香川県	さぬき市	農業用排水施設 L=3,000m ほ場整備 A=1.8ha 農地防災 29ヶ所 鳥獣侵入防止施設 3ヶ所 生態系保全施設整備 1式	L=2,309m A=1.5ha 22ヶ所 3ヶ所 -	27～31	1,125,025	1,092,365	97%	1.64	継続中	
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業(中山間総合(一般型事業))	まんのう	香川県	まんのう町	農業用排水施設 L=7,605m 農道整備 L=801m ほ場整備 A=13.5ha 農地防災 9ヶ所 農業集落道整備 L=650m	L=1,606m L=801m A=9.4ha 6ヶ所 L=577m	27～31	1,247,752	1,135,647	91%	1.54	継続中	
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業(中山間総合(一般型事業))	土庄西部	香川県	土庄町	農業用排水施設 L=5,745m 農道整備 L=400m 農地防災 1式 農業集落道整備 L=825m 農業集落排水施設整備 L=540m	L=4,957m L=74m -	27～31	690,905	632,492	92%	1.29	継続中	
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業(実施計画策定型)	池田	香川県	小豆島町	実施計画策定 1式	1式	28～28	8,614	8,614	100%		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	H28完了
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業(中山間総合(一般型事業))	池田	香川県	小豆島町	農業用排水施設 L=2,100m	L=953m	30～31	150,000	82,000	55%	1.58	継続中	
農村整備	農村集落基盤再編・整備事業(実施計画策定型)	三豊南部	香川県	三豊市	実施計画策定 1式	1式	30～30	6,500	6,500	100%		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	H30完了
農村整備	農道整備事業(広域営農地農道型)	西讃南部	香川県	三豊市	農道整備 L=4,163m	L=784m	27～31	1,870,000	1,306,774	70%	1.62	継続中	
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	湯満	三豊市	三豊市	機能強化対策 1式	1式	27～28	67,800	67,800	100%		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	H28完了
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	丸亀	丸亀市	丸亀市	機能診断 4処理区 最適整備構想作成 1式	4処理区 1式	28～29	14,000	14,000	100%		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	H29完了
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	土庄	土庄町	土庄町	機能診断 1処理区 最適整備構想作成 1式	1処理区 1式	29～29	3,700	3,700	100%		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	H29完了
農村整備	農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)	大浜	三豊市	三豊市	機能強化対策 1式	1式	30～31	53,000	53,000	100%		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	R元完了
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	さぬき	さぬき市	さぬき市	機能診断 6処理区 最適整備構想作成 1式	6処理区 1式	30～31	20,000	20,000	100%		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	R元完了
農村整備	農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)	片岡西	まんのう町	まんのう町	機能診断 1処理区 最適整備構想作成 1式	1処理区 1式	30～30	3,933	3,933	100%		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	H30完了
海岸保全施設整備_農地	海岸堤防等老朽化対策	香川	香川県	高松市 他10市町	施設長寿命化計画策定 46ヶ所	46ヶ所	28～30	100,000	85,074	85%		土地改良法に基づかない事業実施のため未記入	H30完了
農地整備	実施計画策定事業	西庄北部	土地改良事業団体連合会	高松市	実施計画策定 1式	1式	27～27	3,000	3,000	100%		調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	H27完了

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	実施 事業量	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	計画期間内 の総事業費 (千円)	進捗 率	費用対効果	備考
農地整備	実施計画策定事業	割古	土地改良 事業団体 連合会	丸亀市	実施計画策定 1式	1式	27～27	3,000	3,000	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H27 完了
農地整備	実施計画策定事業	天神	土地改良 事業団体 連合会	丸亀市	実施計画策定 1式	1式	27～27	3,000	3,000	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H27 完了
農地整備	実施計画策定事業	西村	土地改良 事業団体 連合会	善通寺 市	実施計画策定 1式	1式	28～28	600	600	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H28 完了
農地整備	実施計画策定事業	阿瀬	土地改良 事業団体 連合会	善通寺 市	実施計画策定 1式	1式	29～29	2,000	2,000	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H29 完了
農地整備	実施計画策定事業	小海	土地改良 事業団体 連合会	東かが わ市	実施計画策定 1式	1式	29～29	1,000	1,000	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H29 完了
農地整備	実施計画策定事業	寺岡	土地改良 事業団体 連合会	三豊市	実施計画策定 1式	1式	27～27	2,000	2,000	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H27 完了
農地整備	実施計画策定事業	河内江谷	土地改良 事業団体 連合会	三豊市	実施計画策定 1式	1式	28～28	2,000	2,000	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H28 完了
農地整備	実施計画策定事業	油井北側	土地改良 事業団体 連合会	観音寺 市	実施計画策定 1式	1式	28～28	3,000	3,000	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H28 完了
農地整備	実施計画策定事業	鍋淵	土地改良 事業団体 連合会	三木町	実施計画策定 1式	1式	28～28	3,000	3,000	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H28 完了
農地整備	実施計画策定事業	有明畑かん	観音寺市 観音寺町 土地改良 区	観音寺 市	実施計画策定 1式	1式	30～30	2,000	2,000	100%	調査及び計画策 定等のソフト整 備のため未記入	H30 完了
合計 (全体 事業費)								5,385,829	4,536,499	84%		

要素事業の事業進捗

概ね計画通り進捗

- ・遅延理由、原因：当初計画どおりの予算確保ができなかったことから、一部事業において進捗が滞った。
- ・対応状況：限られた予算の範囲内で、目標の達成に向けて、効率的な執行に努めている。

2. 今後の方針

継続

- ・農業生産基盤や生活環境基盤の整備を総合的に実施し、農業経営の安定と地域の活性化を推進する。
- ・事業の早期効果発現がなされるようコスト削減に努め、効率的な執行を行う。

事後評価書参考資料


■事後評価（農山漁村地域整備交付金）

さぬきの土と水と農村づくりプラン（Ⅱ期）

農村整備課

香川県

農山漁村地域整備計画位置図 [さぬきの土と水と農村づくりプラン(Ⅱ期)]

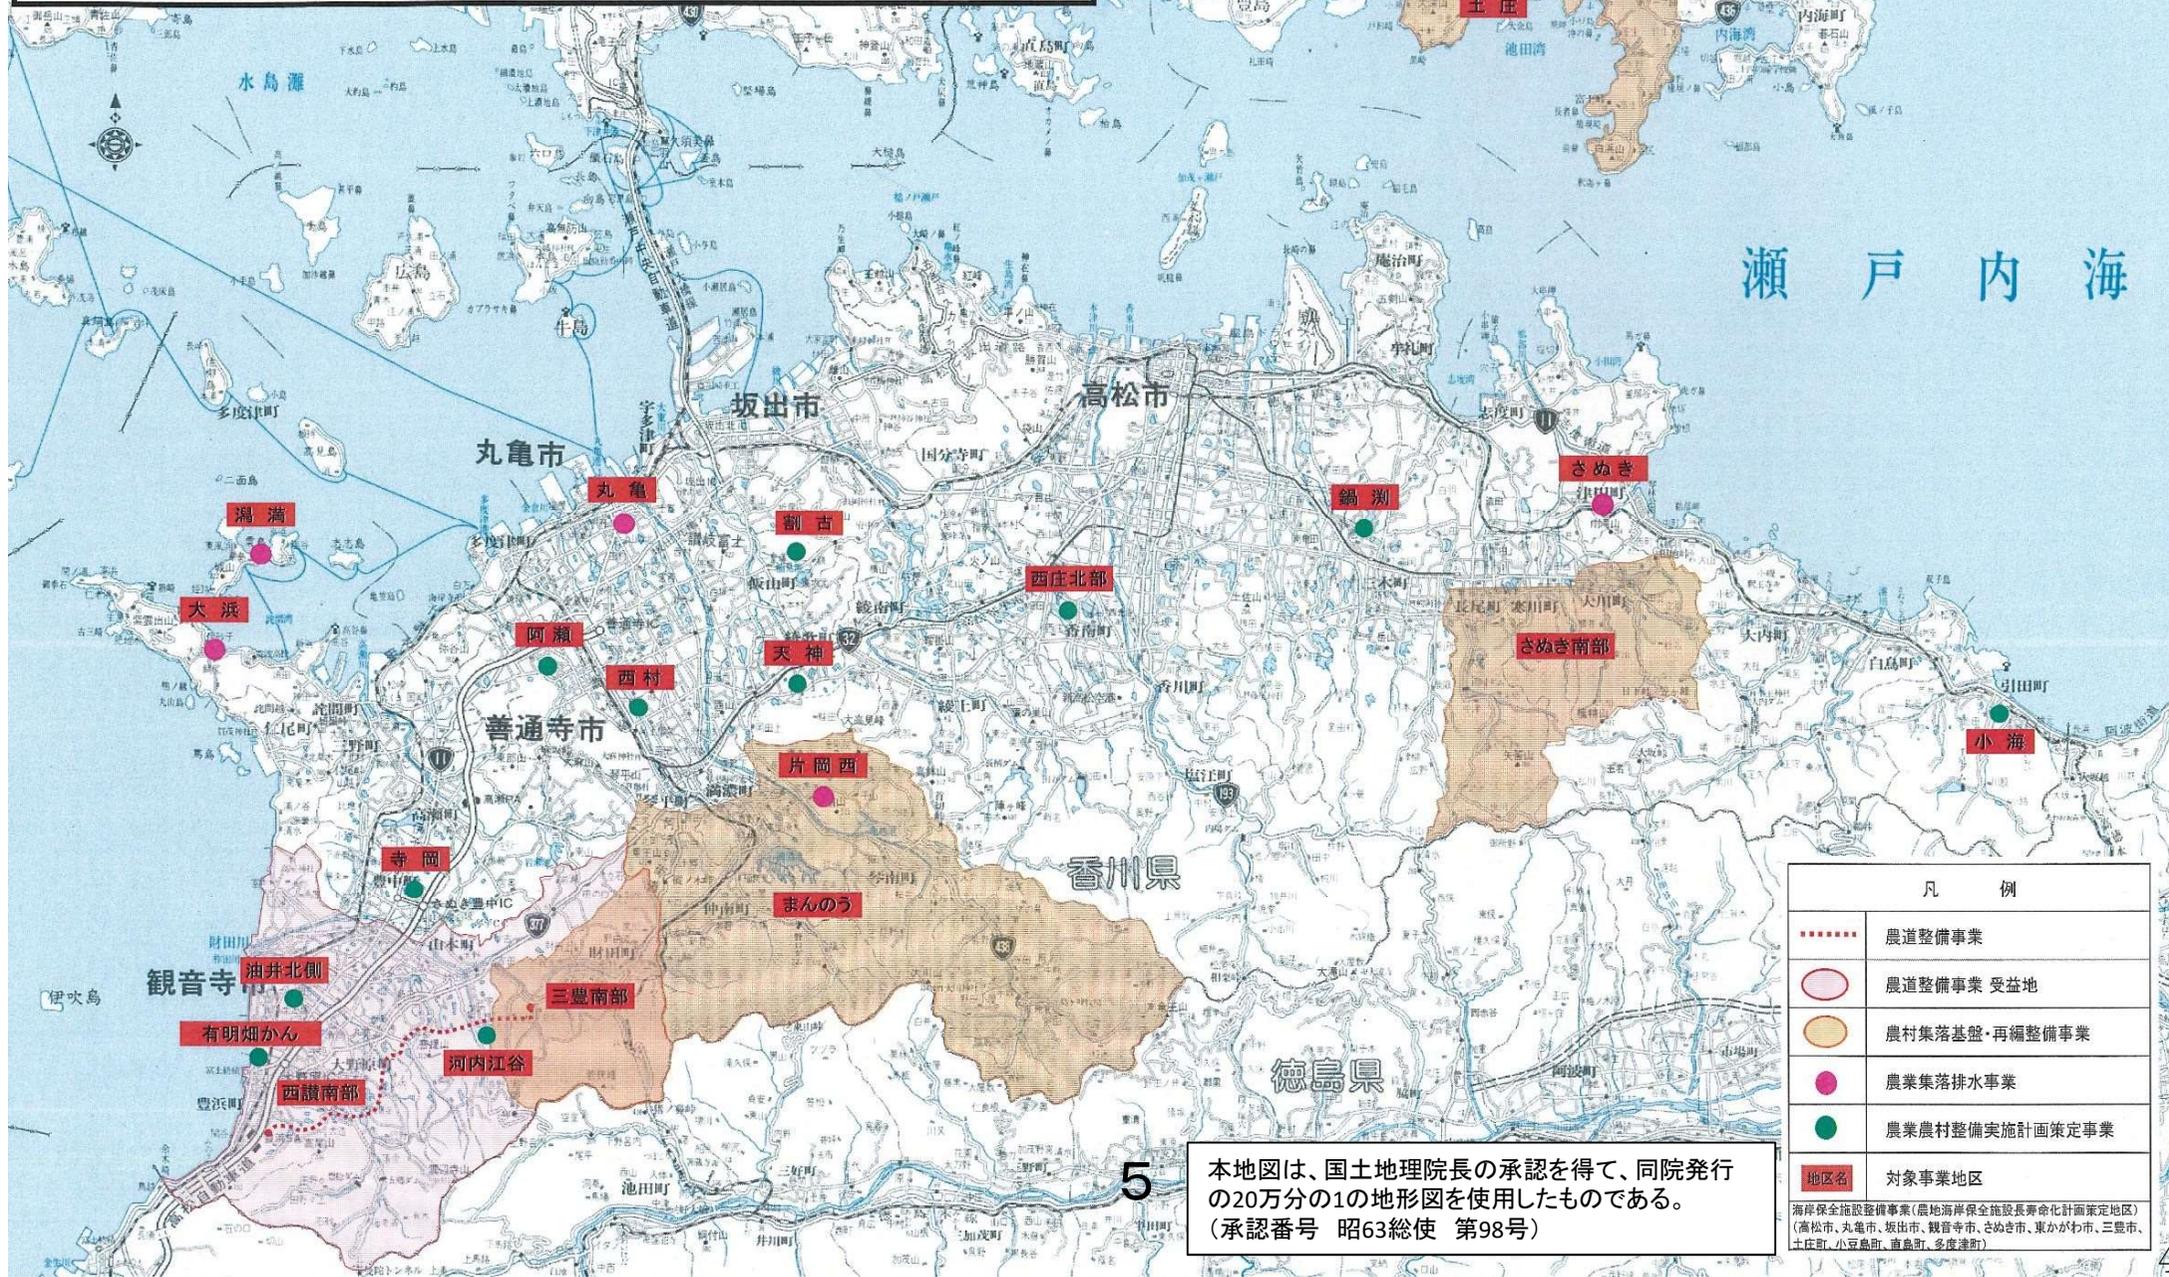

凡 例	
.....	農道整備事業
○	農道整備事業 受益地
■	農村集落基盤・再編整備事業
●	農業集落排水事業
●	農業農村整備実施計画策定事業
地区名	対象事業地区

海岸保全施設整備事業(農地海岸保全施設長寿命化計画策定地区)
 (高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、直島町、多度津町)

5 本地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分の1の地形図を使用したものである。
 (承認番号 昭63総使 第98号)

事業概要

【中山間地域総合整備事業】

生産条件が不利な中山間地域における生産基盤や生活環境基盤を一体的に整備


(対象: さぬき南部、まんのう、土庄西部、池田、三豊南部)



事業概要

【農道整備事業】

農産物の流通合理化や地域間を結ぶアクセス道路として、農道網の基幹となる農道の整備（対象：西讃南部）

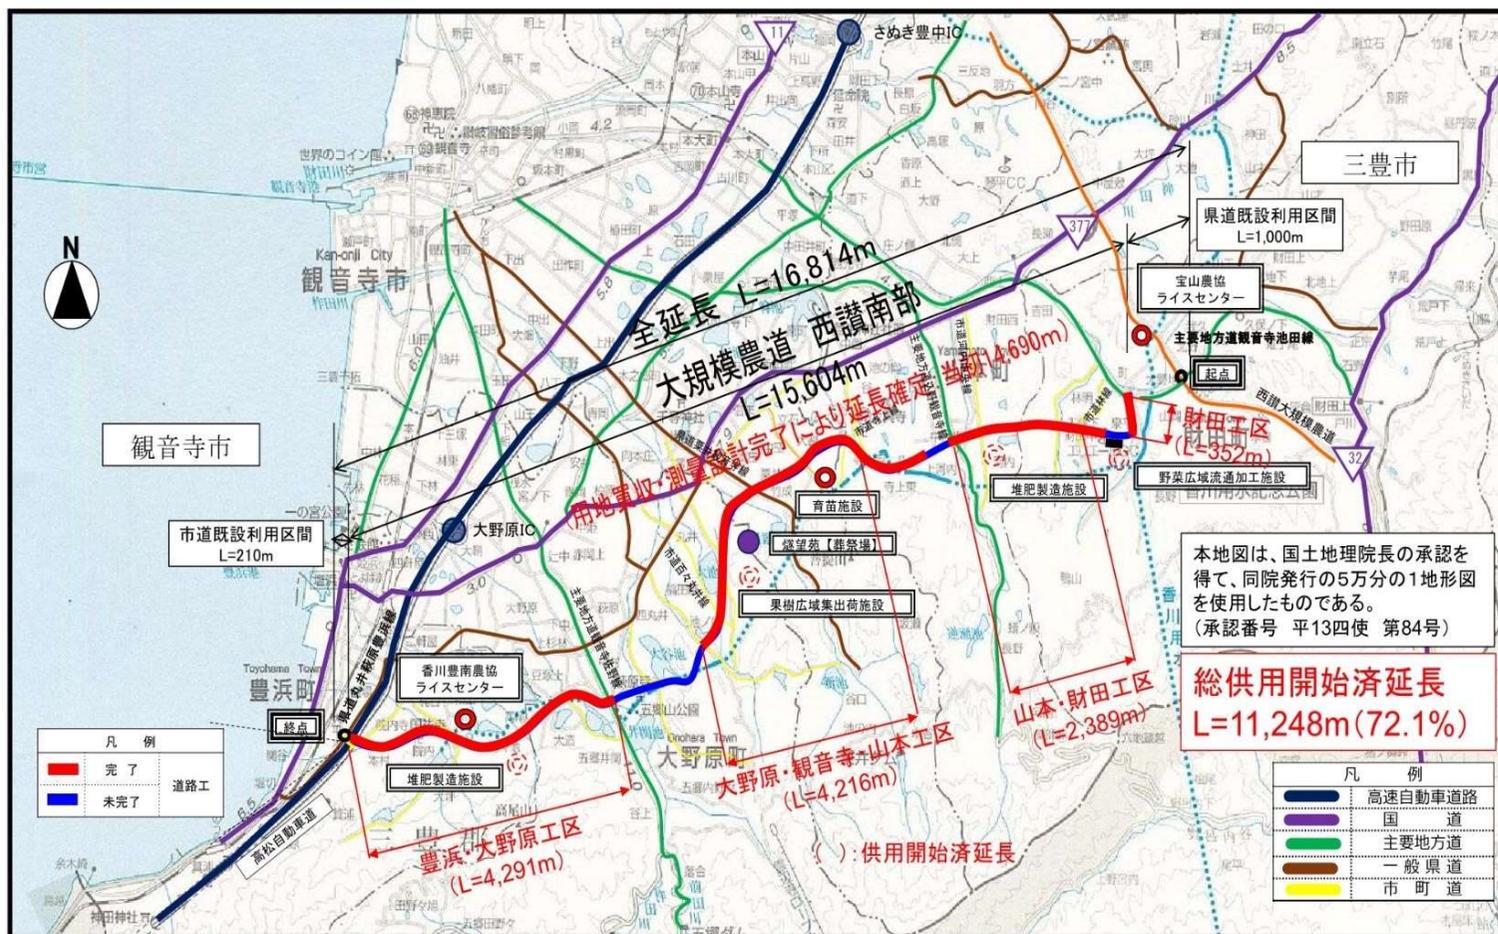

事業概要


【農業集落排水事業】

①農村地域の生活環境改善、農業用排水の水質保全を図る生活排水処理施設の整備・機能強化

②機能診断及び最適整備構想の作成 (対象:丸亀 他3地区)

(対象:渦満、大浜)

■農業集落排水事業のイメージ

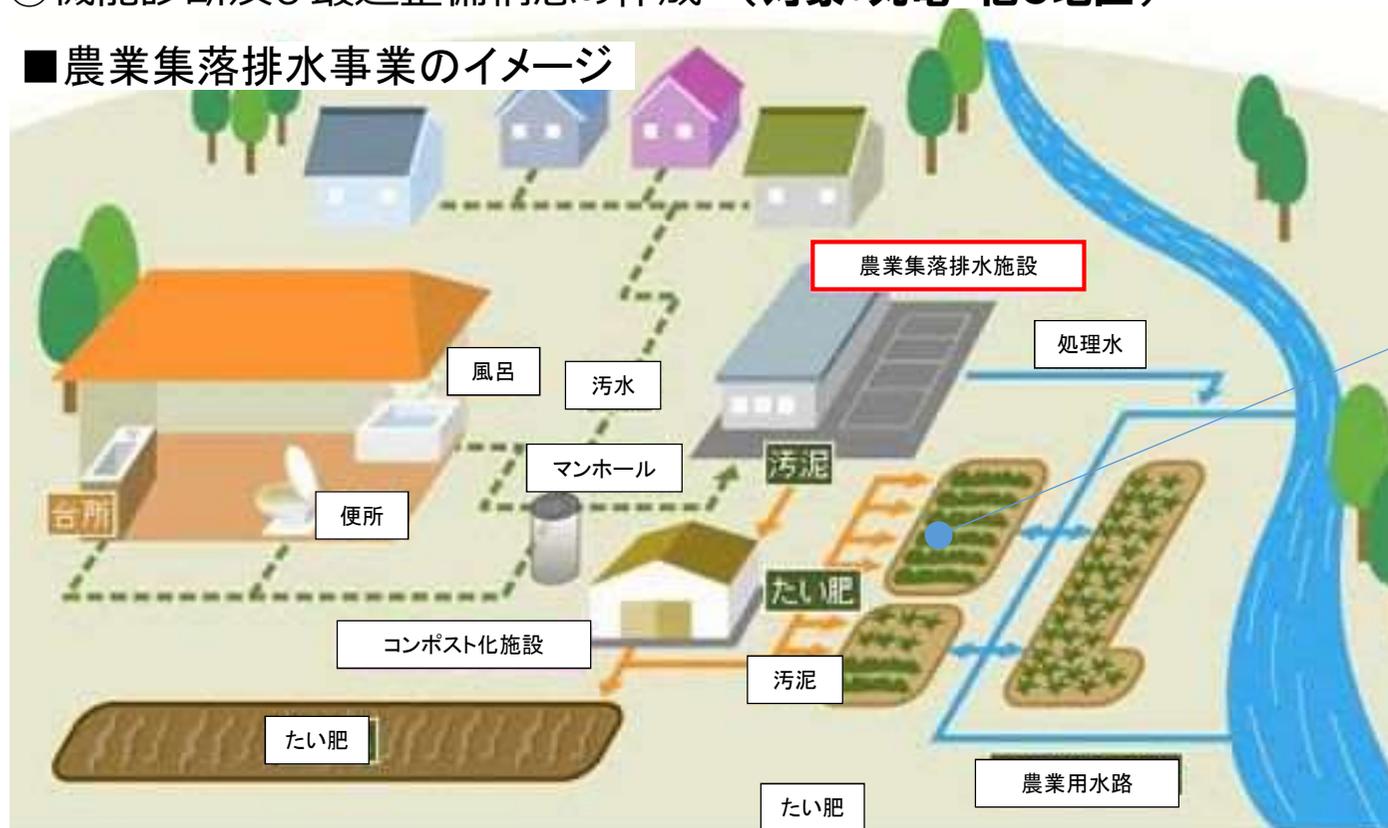

【海岸堤防等老朽化対策事業】

海岸保全施設の老朽化調査及び施設長寿命化計画の策定 (対象:香川(県内46ヶ所))
