

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）

計画の名称	1 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）											
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度（5年間）			交付対象	香川県							
計画の目標	・人命と財産を守るための砂防施設等の整備（安全・安心の向上）											
1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった												
・砂防設備や急傾斜地崩壊防止施設の整備を行ったことにより、土砂災害から保全される人家が130戸、防災拠点施設が4箇所、重要路線が1箇所増加した。 ・長寿命化計画において砂防関係施設の定期点検を行い、計画的かつ効率的な維持管理を図った。												
計画の成果目標（定量的指標）	・土砂災害を受ける恐れのある避難所等の防災拠点 4箇所を保全する。 ・土砂災害を受ける恐れのある重要路線 1箇所を保全する。 ・土砂災害を受ける恐れのある人家密集地等の人家 142戸を保全する。											
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値											
				当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)	達成率	備考				
砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される防災拠点数	目標値： 達成値：			0 箇所	1 箇所	4 箇所 4 箇所	100.0%					
砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される重要路線の危険箇所数	目標値： 達成値：			0 箇所	1 箇所	1 箇所 1 箇所	100.0%					
砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される人家密集地等の人家数	目標値： 達成値：			0 戸	24 戸	142 戸 130 戸	91.5%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	4,520百万円	A	4,520百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	94%
実施事業費	合計 (A+B+C)	4,253百万円	A	4,253百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%		

交付対象事業																	
A 1 砂防事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
1-A1-1	砂防	一般	香川県	直接	-	日開谷川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	東かがわ市						175	159	91%	予算が確保できなかった
1-A1-2	砂防	一般	香川県	直接	-	中徳上川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市						232	232	100%	
1-A1-3	砂防	一般	香川県	直接	-	西堀切川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	観音寺市						260	260	100%	
1-A1-4	砂防	離島	香川県	直接	-	明神川(西村)通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡小豆島町						66	66	100%	
1-A1-5	砂防	一般	香川県	直接	-	尾崎東川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市						181	181	100%	
1-A1-6	砂防	離島	香川県	直接	-	上野川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町						52	52	100%	
1-A1-7	砂防	離島	香川県	直接	-	大開西川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町						95	95	100%	
1-A1-8	砂防	一般	香川県	直接	-	塚原川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市						97	81	84%	予算が確保できなかった
1-A1-9	砂防	一般	香川県	直接	-	中西西川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市	■■■■	■■■■				173	173	100%	
1-A1-10	砂防	一般	香川県	直接	-	中筋六の谷川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	木田郡三木町	■■■■	■■■■				16	16	100%	
1-A1-11	砂防	一般	香川県	直接	-	八ツ池南川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市	■■■■	■■■■	■	■	■	20	0	0%	用地難航箇所
1-A1-12	砂防	一般	香川県	直接	-	田口川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	東かがわ市	■■■■	■■■■				184	184	100%	
1-A1-13	砂防	一般	香川県	直接	-	清水川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市						43	38	88%	予算が確保できなかった
1-A1-14	砂防	一般	香川県	直接	-	東間川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市						45	34	76%	予算が確保できなかった
1-A1-15	砂防	一般	香川県	直接	-	津柳八の谷川通常砂防事業	砂防堰堤工3基	木田郡三木町	■■■■	■■■■				353	353	100%	
1-A1-16	砂防	一般	香川県	直接	-	つづき谷川通常砂防事業	砂防堰堤工2基	高松市	■■■■	■■■■				138	138	100%	
1-A1-17	砂防	一般	香川県	直接	-	宮東中川通常砂防事業	砂防堰堤工2基	高松市						99	73	74%	予算が確保できなかった
1-A1-18	砂防	一般	香川県	直接	-	中代中川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市						79	37	47%	予算が確保できなかった
1-A1-19	砂防	一般	香川県	直接	-	南谷南川通常砂防事業	砂防堰堤工2基	高松市	■■■■	■■■■				142	142	100%	
1-A1-20	砂防	一般	香川県	直接	-	平岡西川通常砂防事業	砂防堰堤工2基	高松市						48	32	67%	予算が確保できなかった
1-A1-21	砂防	一般	香川県	直接	-	本村川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市						53	37	70%	予算が確保できなかった
1-A1-22	砂防	一般	香川県	直接	-	岩崎川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	善通寺市	■■■■	■■■■				271	271	100%	
1-A1-23	砂防	一般	香川県	直接	-	赤山下川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	丸亀市	■■■■	■■■■				176	176	100%	
1-A1-24	砂防	一般	香川県	直接	-	尾郷上川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	仲多度郡まんのう町						82	59	72%	予算が確保できなかった

1-A1-25	砂防	一般	香川県	直接	—	北出川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	三豊市							11	5	45%	予算が確保できなかった	
1-A1-26	砂防	一般	香川県	直接	—	岡西谷川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	観音寺市							54	44	81%	予算が確保できなかった	
1-A1-27	砂防	一般	香川県	直接	—	西下谷川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	観音寺市							58	52	90%	予算が確保できなかった	
1-A1-28	砂防	一般	香川県	直接	—	上条西川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	三豊市							61	61	100%		
1-A1-29	砂防	一般	香川県	直接	—	杖戸川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	三豊市							106	106	100%		
1-A1-30	砂防	一般	香川県	直接	—	高尾戸川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	三豊市							58	58	100%		
1-A1-31	砂防	離島	香川県	直接	—	平野川通常砂防事業	砂防堰堤工3基	小豆郡小豆島町							8	8	100%		
1-A1-32	砂防	離島	香川県	直接	—	小川東川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡小豆島町							137	137	100%		
1-A1-33	砂防	離島	香川県	直接	—	中筋上川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡小豆島町							75	75	100%		
1-A1-34	砂防	離島	香川県	直接	—	大木戸川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町							31	31	100%		
1-A1-35	砂防	離島	香川県	直接	—	見目川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町							8	8	100%		
1-A1-36	砂防	離島	香川県	直接	—	中条川(1)通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町							131	131	100%		
1-A1-37	砂防	離島	香川県	直接	—	浜脇西川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町							215	215	100%		
1-A1-38	砂防	一般	香川県	直接	—	伏見川通常砂防事業	砂防堰堤工2基	善通寺市							141	141	100%		
1-A1-39	砂防	一般	香川県	直接	—	石舟川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市							36	21	58%	予算が確保できなかった	
1-A1-40	砂防	一般	香川県	直接	—	奥条川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	坂出市							20	0	0%	用地難航箇所	
1-A1-41	砂防	一般	香川県	直接	—	藤村川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市							24	5	21%	予算が確保できなかった	
														小計(砂防事業)		4,254	3,987	94%	

A 2 地すべり対策事業 (該当なし)

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
小計(地すべり対策事業)																	
														0	0		

A 3 急傾斜地崩壊対策事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
1-A3-1	急傾斜	一般	香川県	直接	—	平池グリーンタウン(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工等1式	高松市						158	158	100%	
小計(急傾斜地崩壊対策事業)																	
														158	158	100%	

A 4 総合流域防災事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考		
									H28	H29	H30	R元	R2						
1-A4-1	総合治水	一般	香川県	直接	—	香川東部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画	東かがわ市ほか						36	36	100%			
1-A4-2	総合治水	一般	香川県	直接	—	香川土器川圏域総合流域防災事業	長寿命化計画	丸亀市ほか						36	36	100%			
1-A4-3	総合治水	一般	香川県	直接	—	香川西部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画	観音寺市ほか						36	36	100%			
小計(総合流域防災事業)																			
														108	108	100%			
														合計		4,520	4,253	94%	

B 関連社会資本整備事業 (該当なし)

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
小計(関連社会資本整備事業)																	

C 効果促進事業 (該当なし)

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
小計(効果促進事業)																	

その他関連する事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									H28	H29	H30	R元	R2				
	砂防	一般	香川県	直接	—	鳥坂上川通常砂防事業	砂防堰堤工1基	善通寺市						31	31	100%	
合計																	
														31	31	100%	

要素事業の事業進捗

【概ね計画通り進捗】
 ・予算確保が十分でなかったため進捗が遅れている事業もあるが、概ね計画通り進捗している。

2. 今後の方針

【継続】
 ・県内に土砂災害の危険箇所は6,972箇所あり、全ての箇所を整備するには膨大な費用と期間を要するが、今後も重要度や緊急度から総合的に判断し、地元の協力も得ながら計画的に整備を進めていく。
 ・計画目標通りの予算確保に努める。


事後評価書参考資料

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）

河川砂防課

位置図

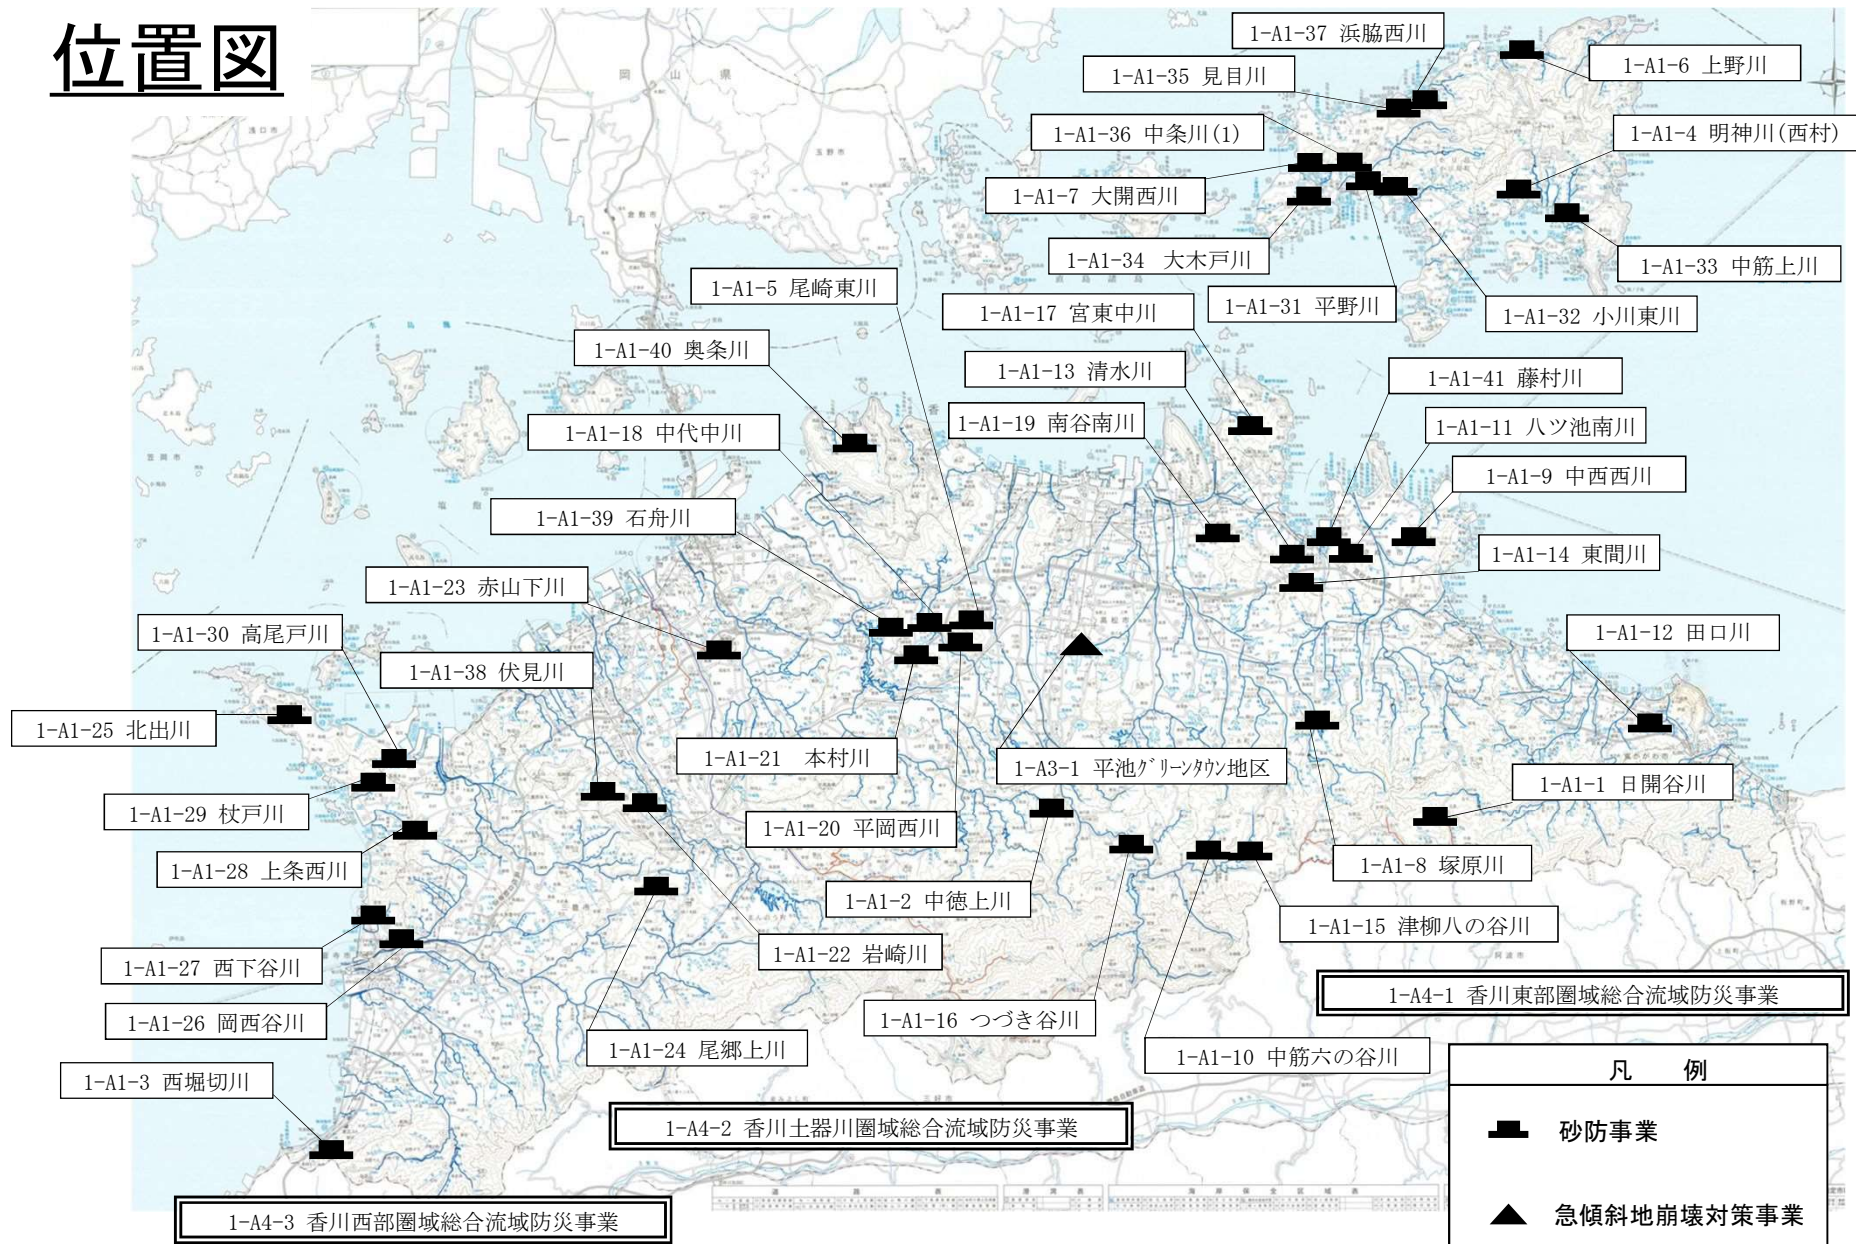

事業概要

① 砂防事業 (41箇所)



② 急傾斜地崩壊対策事業 (1箇所)



③ 総合流域防災事業 (長寿命化計画)



事業概要

事業名	全体数	今回事業内容		計画完了後 整備完了数	残数	
		事業内容	完了数			
砂防事業	1,592溪流	砂防堰堤	41溪流 (41溪流)	3溪流 (3溪流)	418溪流 (418溪流)	1,174溪流 (1,174溪流)
急傾斜地崩壊対策 事業	633箇所	擁壁工等	1箇所 (1箇所)	1箇所 (1箇所)	233箇所 (233箇所)	400箇所 (400箇所)
総合流域防災事業 (長寿命化計画)	1,147施設	定期点検	208施設 (208施設)	208施設 (208施設)	208施設 (208施設)	939施設 (939施設)

()は実績
