

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

安全・安心な通学路づくり（防災・安全）（重点）

計画の名称	1 安全・安心な通学路づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)	交付対象	香川県、高松市、丸亀市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、三豊市、坂出市、三木町
計画の目標	・「通学路交通安全プログラム」に基づく通学路点検や「自転車ネットワーク計画」により対策が必要となった箇所において、歩行者や自転車が安全で安心して通行できる通学路等の生活空間を創出する。		

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があつた

- ・通学者 (徒歩通学・自転車通学) が安心して通学できる歩道及び自転車歩行者道が29.16km整備され、安全に安心して通行できる空間を確保し、一定の効果を確認した。

計画の成果目標 (定量的指標)	・安全・安心な通学路が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上 ・県内の交通事故の死傷者数を3.4%減少させる。		
-----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	安全・安心な通学路が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上 Σ 対策箇所数 / Σ 要対策箇所数 県内の交通事故の死傷者数減少割合 $\{ (H28年の交通事故の死傷者数 - 評価前年の交通事故の死傷者数) / H28年の交通事故の死傷者数 \} \times 100$			定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H29当初) 0% 中間目標値 (R01末) 24% 最終目標値 (R03末) 51% 達成率 69%	備考	
全体事業費	合計 (A+B+C) 34,584百万円	A 34,584百万円	B 百万円	C 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) 0%	進捗率 (事業費ベース) 67%
実施事業費	合計 (A+B+C) 23,270百万円	A 23,270百万円	B 百万円	C 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) 0%	

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H29	H30	R元	R2	R3				
1-A1-1	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 国道193号 (西谷工区)	歩道 990m	高松市						469	384	82%	他事業へ移行
1-A1-2	道路	離島	香川県	直接	香川県	(国) 国道436号 (双子浦工区)	自歩道 900m	土庄町						1,495	1,422	95%	事業費見直し、完了
1-A1-3	道路	離島	香川県	直接	香川県	(国) 国道436号 (赤坂工区)	歩道 720m	小豆島町						200	201	101%	事業費見直し、完了
1-A1-4	道路	離島	香川県	直接	香川県	(国) 国道436号 (池田・室生・草壁本町工区)	自歩道 1630m	小豆島町						255	0	0%	予算が確保できなかった
1-A1-5	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 国道438号 (町代工区)	自歩道 400m	まんのう町						395	0	0%	予算が確保できなかった
1-A1-6	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 国道438号 (炭所西工区)	自歩道 1065m	まんのう町						160	66	41%	予算が確保できなかった
1-A1-7	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 国道438号 (川東下工区)	歩道 600m	まんのう町						175	118	67%	予算が確保できなかった
1-A1-8	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 塩江屋島西線 (亀田工区)	歩道 220m	高松市						175	1	1%	用地離航箇所
1-A1-9	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 中徳三谷高松線 (浦山工区)	歩道 700m	高松市						330	398	121%	事業費見直し、完了
1-A1-10	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 三木国分寺線 (川島東工区)	自歩道 400m	高松市						500	430	86%	予算が確保できなかった
1-A1-11	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 三木綾川線 (池田工区)	歩道 220m	高松市						30	19	63%	事業費見直し、完了
1-A1-12	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 国分寺中通線 (国分寺工区)	歩道 480m	高松市						525	456	87%	予算が確保できなかった
1-A1-13	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 丸亀停車場線 (山北工区)	歩道 450m	丸亀市						225	23	10%	予算が確保できなかった
1-A1-14	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 岡田善通寺線 (綾歌工区)	自歩道 1000m	丸亀市						95	50	53%	事業費見直し、完了
1-A1-15	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 丸亀三好線 (三条工区)	歩道 300m	丸亀市						70	51	73%	事業費見直し、完了
1-A1-16	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 長尾丸亀線 (川西北工区)	歩道 420m	丸亀市						495	497	100%	事業費見直し、完了
1-A1-17	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 高松王越坂出線 (大屋富工区)	自歩道 1240m	坂出市						800	464	58%	予算が確保できなかった
1-A1-18	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 高松善通寺線 (府中工区)	歩道 1000m	坂出市						405	0	0%	予算が確保できなかった
1-A1-19	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 善通寺詫間線 (吉原工区)	自歩道 1500m	善通寺市						240	112	47%	予算が確保できなかった
1-A1-20	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 観音寺善通寺線 (善通寺工区)	自歩道 700m	善通寺市						430	125	29%	予算が確保できなかった
1-A1-21	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 善通寺大野原線 (中田井工区)	歩道 860m	観音寺市						80	34	43%	事業費見直し、完了
1-A1-22	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 栗井観音寺線 (出晴工区)	歩道 780m	観音寺市						595	70	12%	予算が確保できなかった
1-A1-23	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 込野観音寺線 (池之尻工区)	歩道 750m	観音寺市						840	253	30%	予算が確保できなかった
1-A1-24	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 丸亀詫間豊浜線 (室本工区)	歩道 660m	観音寺市						180	98	54%	予算が確保できなかった
1-A1-25	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 丸井萩原豊浜線 (大野原工区)	歩道 1140m	観音寺市						545	274	50%	予算が確保できなかった

1-A1-26	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 丸井萩原豊浜線 (豆塚・姫浜工区)	歩道 1000m	観音寺市										115	123	107%	事業費見直し、完了	
1-A1-27	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 栗井観音寺線 (七間橋工区)	歩道 120m	観音寺市											245	252	103%	事業費見直し、完了
1-A1-28	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 観音寺佐野線 (柞田工区)	歩道 1350m	観音寺市											186	96	52%	他事業へ移行
1-A1-29	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 観音寺佐野線 (萩原工区)	歩道 220m	観音寺市											180	113	63%	事業費見直し、完了
1-A1-30	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 観音寺池田線 (本大工区)	歩道 175m	観音寺市											276	218	79%	予算が確保できなかった
1-A1-31	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 込野観音寺線 (新田工区)	歩道 350m	観音寺市											220	35	16%	予算が確保できなかった
1-A1-32	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 黒瀬本大線 (黒瀬工区)	歩道 280m	観音寺市											97	166	171%	他事業へ移行
1-A1-33	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 富田西鴨庄線 (神崎工区)	歩道 720m	さぬき市											375	375	100%	
1-A1-34	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 石田東志度線 (造田・寒川工区)	自歩道 2400m	さぬき市											136	149	110%	事業費見直し、完了
1-A1-35	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 太田上町志度線 (志度工区)	自歩道 300m	さぬき市											305	232	76%	予算が確保できなかった
1-A1-36	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 三木津田線 (津田工区)	歩道 600m	さぬき市											250	204	82%	予算が確保できなかった
1-A1-37	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 宮尾高瀬線 (津島工区)	歩道 480m	三豊市											145	239	165%	事業費見直し、完了
1-A1-38	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 善通寺詫間線 (大見工区)	歩道 1040m	三豊市											530	79	15%	予算が確保できなかった
1-A1-39	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 帰来本山停車場線 (下高野工区)	歩道 420m	三豊市											25	13	52%	事業費見直し、完了
1-A1-40	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 財田上高瀬線 (財田工区)	歩道 1700m	三豊市											264	122	46%	予算が確保できなかった
1-A1-41	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 詫間琴平線 (上勝間工区)	歩道 860m	三豊市											270	236	87%	予算が確保できなかった
1-A1-42	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 詫間琴平線 (樫谷工区)	歩道 600m	三豊市											255	149	58%	予算が確保できなかった
1-A1-43	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 財田西豊中線 (大野工区)	歩道 850m	三豊市											745	131	18%	予算が確保できなかった
1-A1-44	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 善通寺大野原線 (羽方工区)	歩道 550m	三豊市											105	47	45%	事業費見直し、完了
1-A1-45	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 観音寺池田線 (山本工区)	歩道 1400m	三豊市											350	32	9%	予算が確保できなかった
1-A1-46	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 大見吉津仁尾線 (吉津工区)	歩道 600m	三豊市											375	81	22%	予算が確保できなかった
1-A1-47	道路	離島	香川県	直接	香川県	(主) 土庄福田線 (洲崎工区)	歩道 320m	土庄町											1,655	338	20%	他事業へ移行
1-A1-48	道路	離島	香川県	直接	香川県	(一) 屋形崎小江洲崎線 (洲崎工区)	歩道 1080m	土庄町											485	342	71%	予算が確保できなかった
1-A1-49	道路	離島	香川県	直接	香川県	(主) 土庄福田線 (黒岩・馬越工区)	歩道 940m	土庄町											345	167	48%	予算が確保できなかった
1-A1-50	道路	離島	香川県	直接	香川県	(主) 坂手港線 (苗羽工区)	歩道 140m	小豆島町											346	289	84%	予算が確保できなかった
1-A1-51	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 三木牟礼線 (立石工区)	歩道 540m	三木町											260	272	105%	事業費見直し、完了
1-A1-52	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 三木綾川線 (上高岡工区)	歩道 1250m	三木町											195	250	128%	事業費見直し、完了
1-A1-53	道路	離島	香川県	直接	香川県	(一) 北風戸積浦線 (宮浦工区)	歩道 250m	直島町											80	31	39%	事業費見直し、完了
1-A1-54	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 綾川府中線 (綾川工区)	自歩道 1100m	綾川町											335	228	68%	予算が確保できなかった
1-A1-55	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 綾歌綾川線 (千疋工区)	歩道 600m	綾川町											55	56	102%	事業費見直し、完了
1-A1-56	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 琴平停車場琴平公園線 (琴平工区)	電線共同溝 500m	琴平町											157	154	98%	予算が確保できなかった
1-A1-57	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 丸亀詫間豊浜線 (多度津西工区)	自歩道 2800m	多度津町											3,411	3,518	103%	事業費見直し、完了
1-A1-58	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 多度津丸亀線 (多度津工区)	自歩道 1060m	多度津町											695	616	89%	事業費見直し、完了
1-A1-59	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 炭所東琴平線 (吉野工区)	歩道 670m	まんのう町											120	97	81%	事業費見直し、完了
1-A1-60	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 財田まんのう線 (大口工区)	歩道 900m	まんのう町											320	0	0%	事業凍結中
1-A1-61	道路	一般	香川県	直接	高松市	(2) 香川綾南線 (高松市香南町)	歩道 470m	高松市											44	32	73%	事業費見直し、完了
1-A1-62	道路	一般	香川県	直接	高松市	(1) 木太鬼無線 (西春日鶴市工区)	歩道 200m	高松市											410	377	92%	事業費見直し、完了
1-A1-63	道路	一般	香川県	直接	高松市	(1) 朝日町仏生山線	歩道 530m	高松市											609	971	159%	
1-A1-64	道路	一般	香川県	直接	高松市	(1) 栗林上福岡線 (桜町工区)	歩道 1100m	高松市											210	0	0%	事業凍結中
1-A1-65	道路	一般	香川県	直接	丸亀市	(2) 西土器南北線 (土器町西工区)	歩道 500m	丸亀市											354	168	47%	事業費見直し、完了
1-A1-66	道路	一般	香川県	直接	善通寺市	(他) 総本山国病東側線 (善通寺市)	歩道 300m	善通寺市											15	4	27%	事業費見直し、完了
1-A1-67	道路	一般	香川県	直接	観音寺市	(2) 栗屋堂之岡線	自歩道 450m	観音寺市											275	214	78%	予算が確保できなかった
1-A1-68	道路	一般	香川県	直接	観音寺市	(1) 国道小学校線外1線	歩道 300m	観音寺市											84	120	143%	事業費見直し、完了
1-A1-69	道路	一般	香川県	直接	観音寺市	(1) 観音寺大野原線	歩道 150m	観音寺市											169	75	44%	予算が確保できなかった
1-A1-70	道路	一般	香川県	直接	さぬき市	(他) 志度駅南中央線	歩道 340m	さぬき市											210	184	88%	事業費見直し、完了
1-A1-71	道路	一般	香川県	直接	三豊市	(他) 摺木友信線	歩道 2000m	三豊市											397	315	79%	用地難航箇所
1-A1-72	道路	一般	香川県	直接	三豊市	(1) 田井徳満線	歩道 2000m	三豊市											458	126	28%	用地難航箇所
1-A1-73	道路	一般	香川県	直接	三豊市	(1) 経面加嶺峠線	歩道 480m	三豊市											145	100	69%	用地難航箇所
1-A1-74	道路	一般	香川県	直接	香川県	(主) 高松長尾大内線 (大内工区)	自歩道 2800m	東かがわ市											358	366	102%	事業費見直し、完了
1-A1-75	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 国道438号 (東坂元工区)	自歩道・歩道橋設置 200m	丸亀市											290	284	98%	事業費見直し、完了
1-A1-76	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 石田東志度線 (末工区)	自歩道 1100m	さぬき市											40	13	33%	事業費見直し、完了
1-A1-77	道路	一般	香川県	直接	香川県	(国) 国道318号 (白鳥工区)	自歩道 660m	東かがわ市											133	217	163%	
1-A1-78	道路	離島	香川県	直接	香川県	(国) 国道436号 (洲崎工区)	自歩道 280m	土庄町											276	355	129%	
1-A1-79	道路	離島	香川県	直接	香川県	(国) 国道436号 (池田工区)	自歩道 1000m	小豆島町											75	67	89%	事業費見直し、完了
1-A1-80	道路	離島	香川県	直接	香川県	(国) 国道436号 (室生工区)	自歩道 330m	小豆島町											245	271	111%	事業費見直し、完了
1-A1-81	道路	離島	香川県	直接	香川県	(国) 国道436号 (草壁本町工区)	自歩道 340m	小豆島町											440	359	82%	事業費見直し、完了
1-A1-82	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 岩崎高松線 (香川工区)	歩道 300m	高松市											333	338	102%	事業費見直し、完了
1-A1-83	道路	一般	香川県	直接	香川県	(一) 鴨川停車場五色台線 (高屋工区)	自歩道 200m	坂出市											314	0	0%	他事業へ移行

C 効果促進事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H29	H30	R元	R2	R3				
													0	0	0%		
										合計			0	0	0%		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H29	H30	R元	R2	R3				
													0	0	0%		
										合計			0	0	0%		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

その他関連する事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H29	H30	R元	R2	R3				
													0	0	0%		
										合計			0	0	0%		

A'	百万円	B'		C'		$(C+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	0%
A'	百万円	B'		C'		$(C+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	0%

<p><u>要素事業の事業進捗</u></p> <p>概ね計画通り進捗</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算確保が十分でなかったこと及び用地買収が難航したことにより進捗が遅れている事業もあるが、概ね計画通り進捗している。 													
<p><u>2. 今後の方針</u></p> <p>継続</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 早期に事業効果が発現できるよう、予算確保に努め、事業の進捗を図る。 ・ 用地難航箇所においては、地権者に対する説明回数を増やし、理解を求めていく。 													

事後評価書参考資料


■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

安全・安心な通学路づくり（防災・安全）（重点）

道路課

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	安全・安心な通学路づくり（防災・安全）		
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）	交付団体	香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、三豊市、三木町

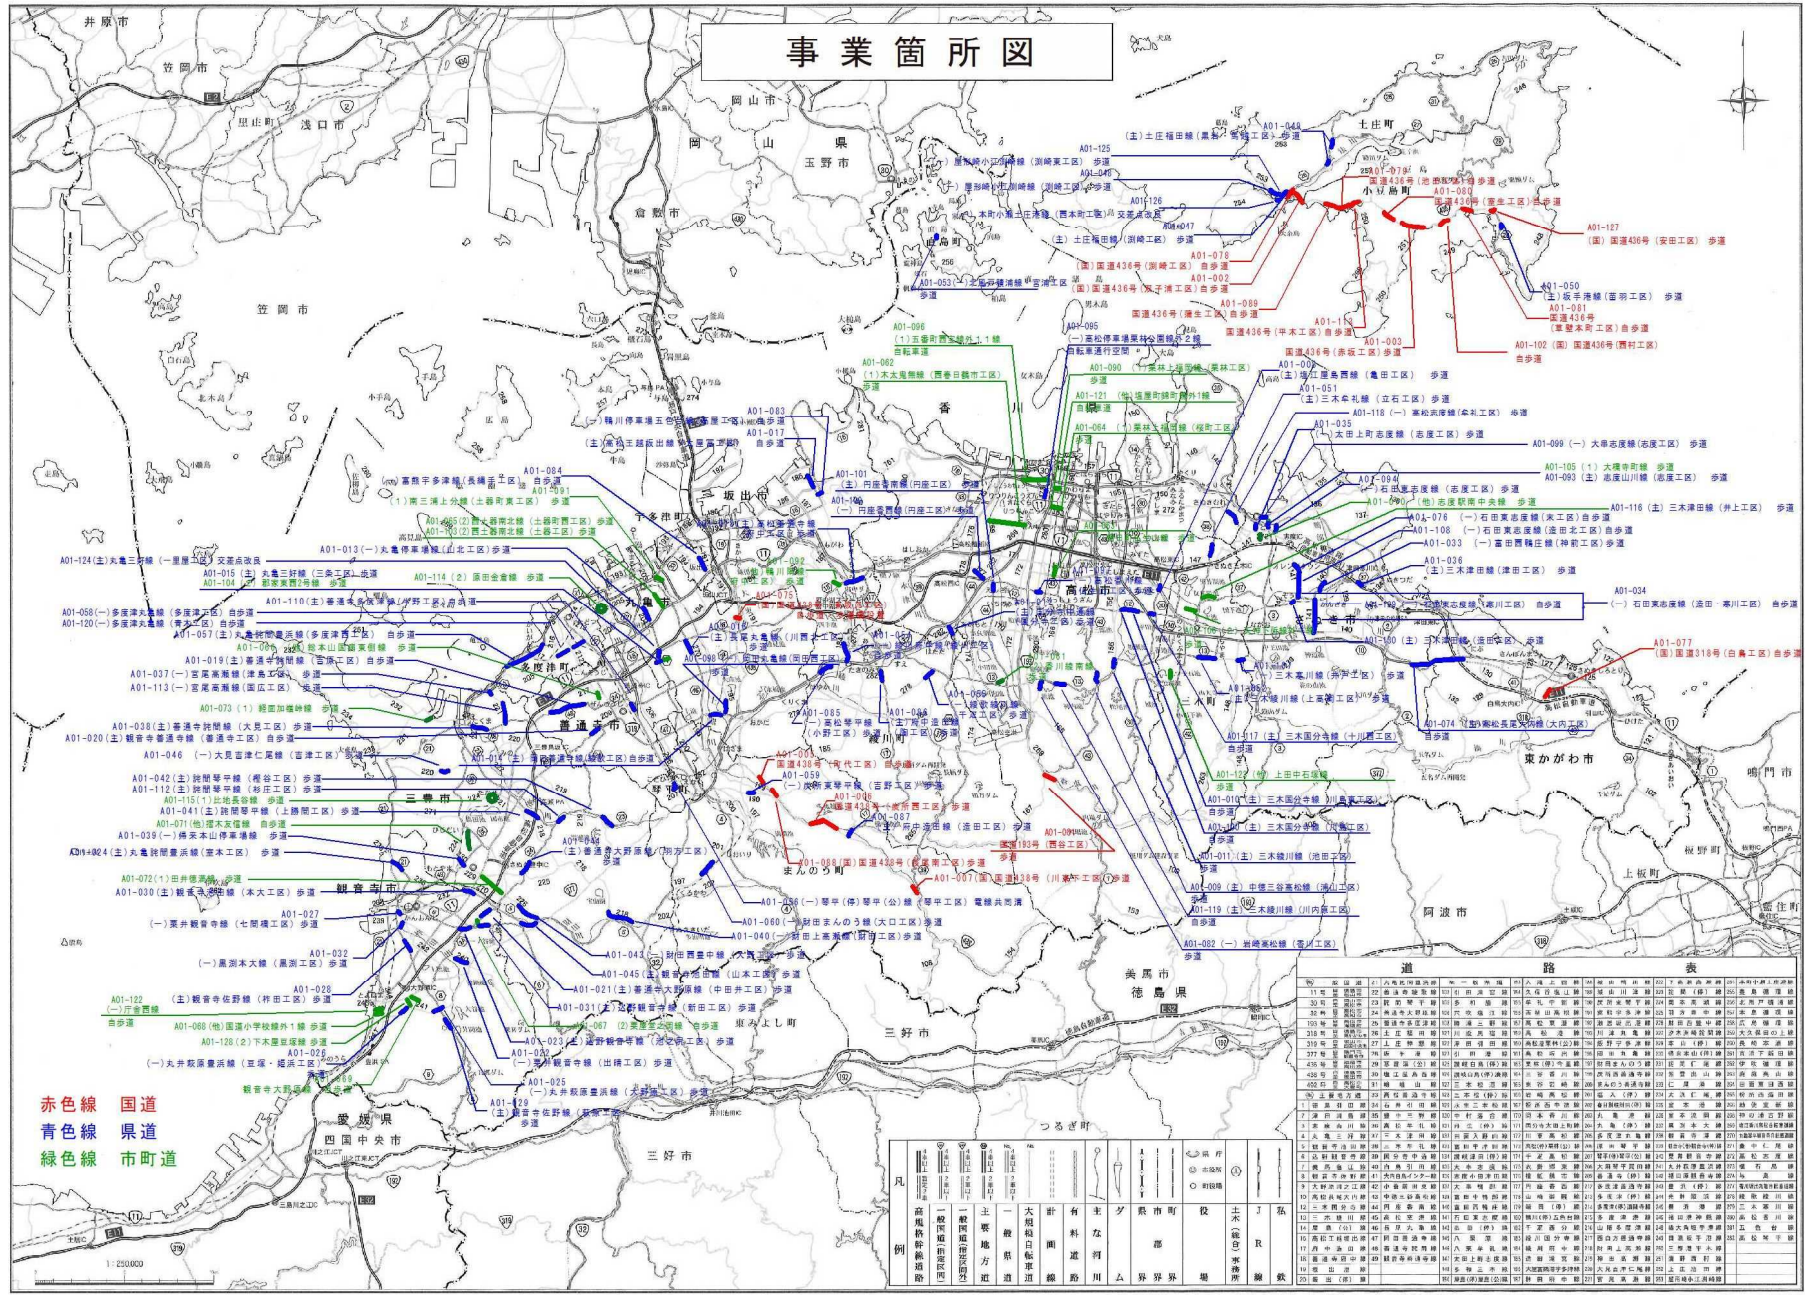

この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用し作成したものである。（平29四使 第1号）

事業概要

()は実績

事業内容			計画完了後	残数	合計
			整備完了数		
歩道整備	89箇所	L=52km	43箇所	46箇所	89箇所
			(32箇所)	(57箇所)	(89箇所)
自転車歩行者道整備	35箇所	L=32km	21箇所	14箇所	35箇所
			(13箇所)	(22箇所)	(35箇所)
自転車道整備	2箇所	L=9km	0箇所	2箇所	2箇所
			(0箇所)	(2箇所)	(2箇所)
電線共同溝	1箇所	L=0.5km	1箇所	0箇所	1箇所
			(0箇所)	(1箇所)	(1箇所)
交差点改良	2箇所	L=0.42km	1箇所	1箇所	2箇所
			(0箇所)	(2箇所)	(2箇所)
自転車通行空間	1箇所	L=11.2km	0箇所	1箇所	1箇所
			(1箇所)	(0箇所)	(1箇所)
計画完了後計			66	64	130箇所
整備完了数計			(46)	(84)	(130箇所)

事業概要

■通学路の交通安全対策

香川県三豊市豊中町
(一) 帰来本山停車場線(下高野工区)ほか



整備前



整備後(H29完了)


通学路等の生活空間における交通安全対策を実施し、
安全に安心して通学できる歩道を整備。

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

計画の名称	安全・安心な通学路づくり（防災・安全）		
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）	交付団体	香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、三豊市、三木町

未完了箇所図

未完了箇所は路線名・工区名に赤下線記載

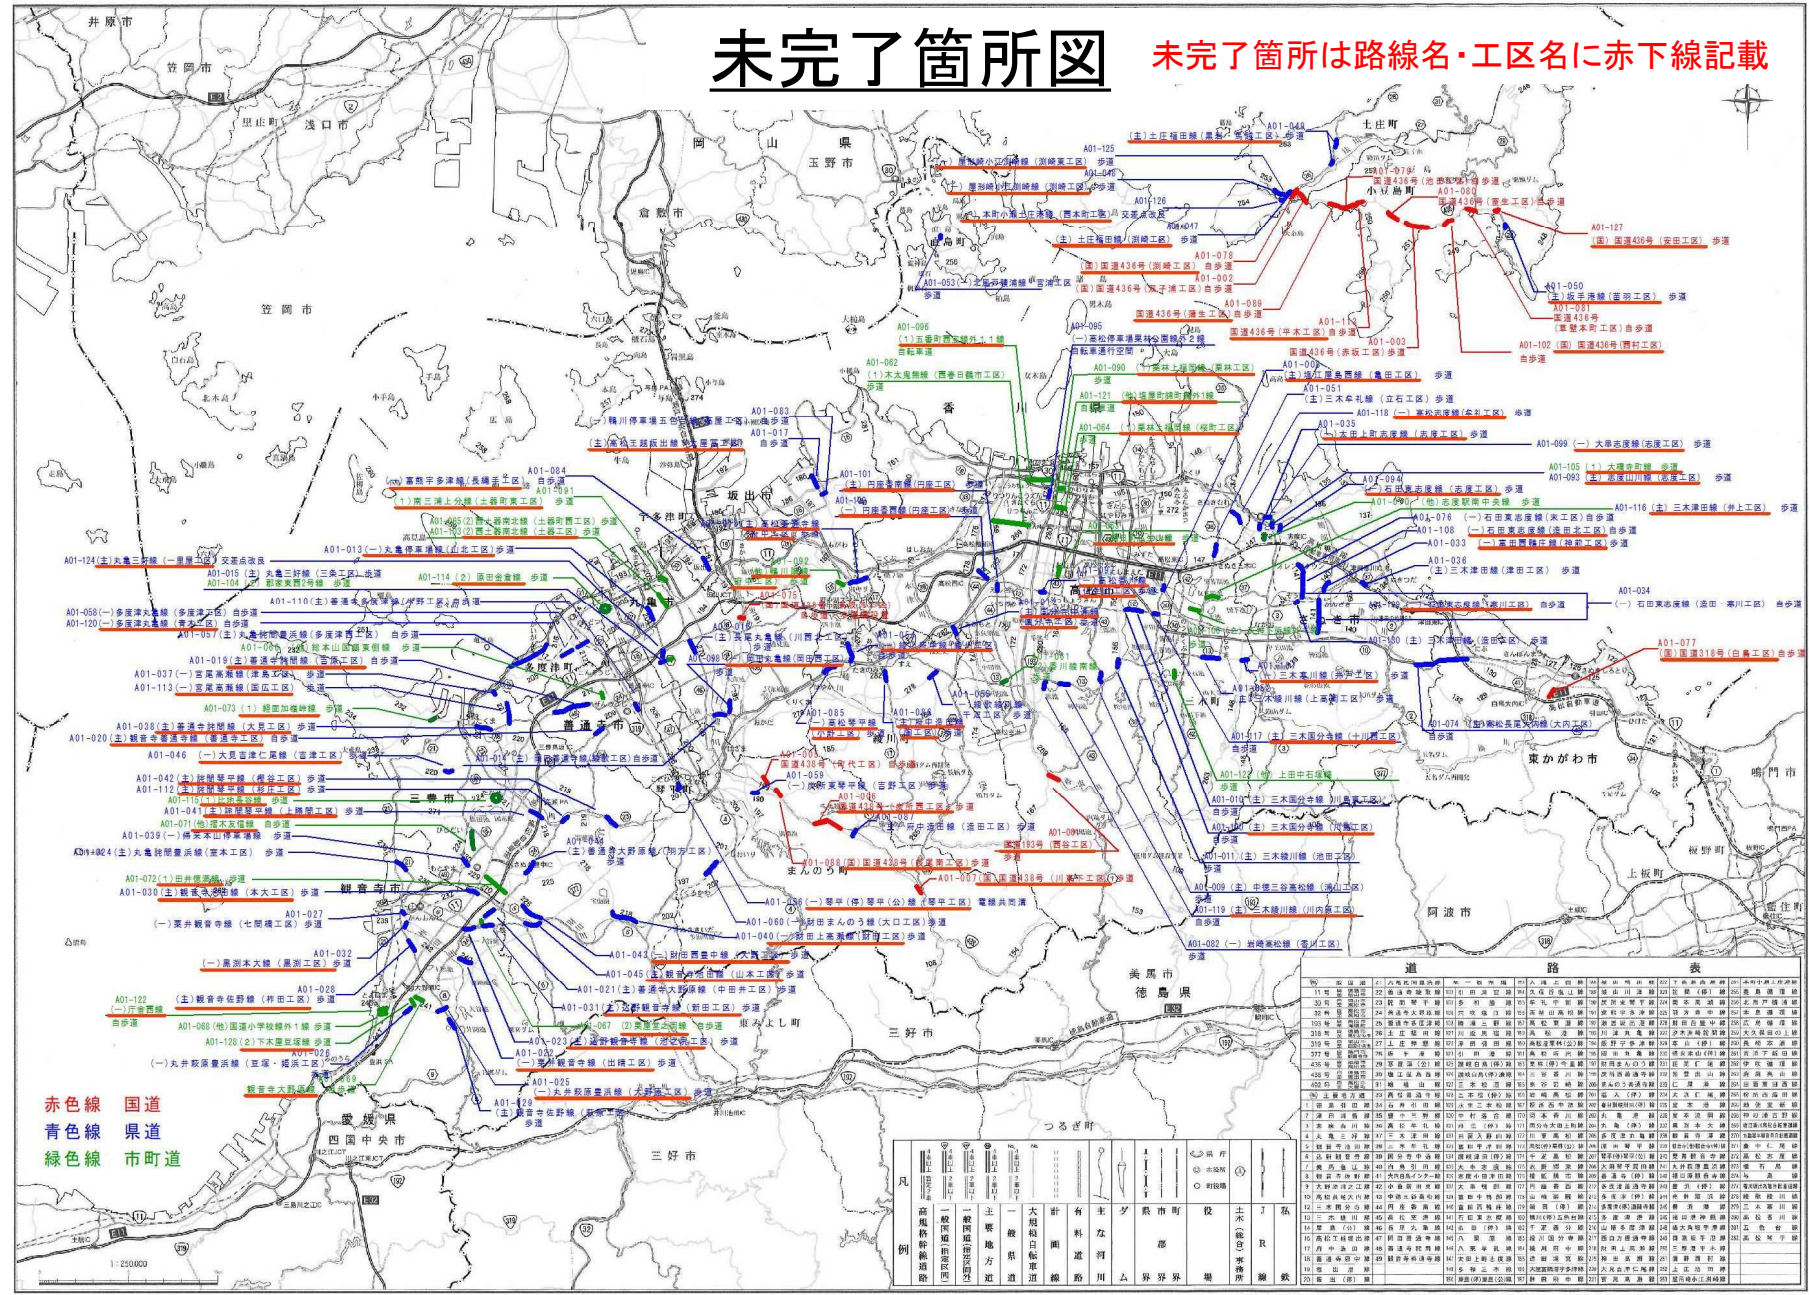

路線番号	路線名	起点	終点	備考
11	高松市街	丸亀市街	高松市街	
12	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
13	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
14	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
15	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
16	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
17	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
18	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
19	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
20	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
21	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
22	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
23	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
24	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
25	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
26	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
27	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
28	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
29	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
30	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
31	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
32	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
33	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
34	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
35	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
36	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
37	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
38	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
39	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
40	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
41	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
42	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
43	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
44	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
45	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
46	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
47	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
48	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
49	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
50	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
51	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
52	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
53	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
54	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
55	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
56	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
57	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
58	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
59	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
60	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
61	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
62	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
63	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
64	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
65	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
66	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
67	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
68	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
69	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
70	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
71	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
72	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
73	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
74	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
75	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
76	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
77	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
78	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
79	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
80	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
81	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
82	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
83	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
84	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
85	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
86	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
87	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
88	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
89	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
90	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
91	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
92	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
93	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
94	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
95	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
96	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
97	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
98	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
99	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	
100	丸亀市街	丸亀市街	丸亀市街	

この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用し作成したものである。（平29四使 第1号）
