

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）

計画の名称	1 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）																																	
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）			交付対象	香川県																													
計画の目標	・ 人命と財産を守るための砂防施設の整備（安全・安心の向上）																																	
<p><b>1. 事業効果の発現状況</b> : 一定の効果があった</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 砂防施設の整備を行ったことにより、土砂災害から保全される防災拠点施設が5箇所、要配慮者施設が2箇所、人家が395戸増加した。</li> <li>・ 長寿命化計画において砂防関係施設の定期点検を行い、点検結果に基づき必要に応じて修繕工事を実施するなど、適切な維持管理を図った。</li> </ul>																																		
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土砂災害を受ける恐れのある避難所等の防災拠点5箇所を保全する。</li> <li>・ 土砂災害を受ける恐れのある要配慮者施設2箇所を保全する。</li> <li>・ 土砂災害を受ける恐れのある人家密集地等の人家459戸を保全する。</li> </ul>																																	
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (R3当初)</th> <th>中間目標値 (R5末)</th> <th>最終目標値 (R7末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される防災拠点数</td> <td>0 箇所</td> <td>2 箇所</td> <td>5 箇所 5 箇所</td> <td>100.0%</td> <td>達成率 (防災拠点) 最終目標数 : 5箇所 達成数 : 5箇所</td> </tr> <tr> <td>砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される要配慮者施設数</td> <td>0 箇所</td> <td>0 箇所</td> <td>2 箇所 2 箇所</td> <td>100.0%</td> <td>(要配慮者施設) 最終目標数 : 2箇所 達成数 : 2箇所 達成率 : 2/2 = 100%</td> </tr> <tr> <td>砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される人家密集地等の人家数</td> <td>0 戸</td> <td>360 戸</td> <td>459 戸 395 戸</td> <td>86.1%</td> <td>(保全人家) 最終目標数 : 459戸 達成数 : 395戸 達成率 : 395/459 ≈ 86%</td> </tr> </tbody> </table>								定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考	当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)	砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される防災拠点数	0 箇所	2 箇所	5 箇所 5 箇所	100.0%	達成率 (防災拠点) 最終目標数 : 5箇所 達成数 : 5箇所	砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される要配慮者施設数	0 箇所	0 箇所	2 箇所 2 箇所	100.0%	(要配慮者施設) 最終目標数 : 2箇所 達成数 : 2箇所 達成率 : 2/2 = 100%	砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される人家密集地等の人家数	0 戸	360 戸	459 戸 395 戸	86.1%	(保全人家) 最終目標数 : 459戸 達成数 : 395戸 達成率 : 395/459 ≈ 86%
	定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考																													
	当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)																															
砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される防災拠点数	0 箇所	2 箇所	5 箇所 5 箇所	100.0%	達成率 (防災拠点) 最終目標数 : 5箇所 達成数 : 5箇所																													
砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される要配慮者施設数	0 箇所	0 箇所	2 箇所 2 箇所	100.0%	(要配慮者施設) 最終目標数 : 2箇所 達成数 : 2箇所 達成率 : 2/2 = 100%																													
砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される人家密集地等の人家数	0 戸	360 戸	459 戸 395 戸	86.1%	(保全人家) 最終目標数 : 459戸 達成数 : 395戸 達成率 : 395/459 ≈ 86%																													
全体事業費	合計 (A+B+C)	4,075百万円	A	4,075百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	85%																						
実施事業費	合計 (A+B+C)	3,458百万円	A	3,458百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%																								

交付対象事業																	
A 1 砂防事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				
1-A1-1	砂防	一般	香川県	直接	—	日開谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	東かがわ市						89	89	100%	完了
1-A1-2	砂防	一般	香川県	直接	—	中筋六の谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	木田郡三木町						100	14	14%	用地難航箇所
1-A1-3	砂防	一般	香川県	直接	—	田口川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	東かがわ市						136	136	100%	完了
1-A1-4	砂防	一般	香川県	直接	—	清水川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市						38	38	100%	
1-A1-5	砂防	一般	香川県	直接	—	東間川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市						403	403	100%	
1-A1-6	砂防	一般	香川県	直接	—	つづき谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工2基	高松市						228	228	100%	完了
1-A1-7	砂防	一般	香川県	直接	—	宮東中川 通常砂防事業	砂防堰堤工2基	高松市						100	18	18%	用地難航箇所
1-A1-8	砂防	一般	香川県	直接	—	中代中川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市						35	35	100%	
1-A1-9	砂防	一般	香川県	直接	—	尾崎東川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市						35	35	100%	完了
1-A1-10	砂防	一般	香川県	直接	—	南谷南川 通常砂防事業	砂防堰堤工2基	高松市						28	28	100%	
1-A1-11	砂防	一般	香川県	直接	—	平岡西川(1) 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市						215	215	100%	
1-A1-12	砂防	一般	香川県	直接	—	本村川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市						100	19	19%	用地難航箇所
1-A1-13	砂防	一般	香川県	直接	—	石舟川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市						240	9	4%	用地難航箇所(当初完了予定)
1-A1-14	砂防	一般	香川県	直接	—	奥糸川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	坂出市						58	58	100%	
1-A1-15	砂防	一般	香川県	直接	—	尾郷上川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	仲多度郡まんのう町						78	78	100%	
1-A1-16	砂防	一般	香川県	直接	—	岡西谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	観音寺市						126	126	100%	
1-A1-17	砂防	一般	香川県	直接	—	西下谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	観音寺市						216	216	100%	
1-A1-18	砂防	一般	香川県	直接	—	上条西川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	三豊市						255	255	100%	完了
1-A1-19	砂防	一般	香川県	直接	—	高尾戸川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	三豊市						1	1	100%	
1-A1-20	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	明神川(西村) 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡小豆島町						74	74	100%	

1-A1-21	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	上野川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町							100	37	37%	用地難航箇所
1-A1-22	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	大開西川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町							65	65	100%	完了
1-A1-23	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	平野川 通常砂防事業	砂防堰堤工3基	小豆郡小豆島町							100	26	26%	用地難航箇所
1-A1-24	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	小川東川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡小豆島町							174	174	100%	
1-A1-25	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	中筋上川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡小豆島町							45	45	100%	
1-A1-26	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	大木戸川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町							157	157	100%	
1-A1-27	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	見目川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町							78	78	100%	
1-A1-28	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	中条川(1) 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡土庄町							238	238	100%	
1-A1-29	砂防	一般	香川県	直接	—	伏見川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	善通寺市							88	88	100%	
1-A1-30	砂防	一般	香川県	直接	—	藤村川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市							74	74	100%	
1-A1-31	砂防	一般	香川県	直接	—	夏木谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	東かがわ市							65	65	100%	
1-A1-32	砂防	一般	香川県	直接	—	拍子谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	三豊市							63	63	100%	
1-A1-33	砂防	一般	香川県	直接	—	塚原川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	さぬき市							55	55	100%	完了
1-A1-34	砂防	一般	香川県	直接	—	津柳八の谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工3基	木田郡三木町							30	30	100%	完了
1-A1-35	砂防	一般	香川県	直接	—	在所川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	善通寺市							32	32	100%	
1-A1-36	砂防	一般	香川県	直接	—	西堀切川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	観音寺市							60	60	100%	
1-A1-37	砂防	一般	香川県	直接	—	平岡西川(2) 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	高松市							30	30	100%	
1-A1-38	砂防	一般	香川県	直接	—	原谷川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	三豊市							20	20	100%	
1-A1-39	砂防	一般・離島	香川県	直接	—	西城東川 通常砂防事業	砂防堰堤工1基	小豆郡小豆島町							25	25	100%	
小計(砂防事業)														4,054	3,437	85%		
A 2 地すべり対策事業 (該当なし)																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考	
									R3	R4	R5	R6	R7					
小計(地すべり対策事業)														0	0			
A 3 急傾斜地崩壊対策事業 (該当なし)																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考	
									R3	R4	R5	R6	R7					
小計(急傾斜地崩壊対策事業)														0	0			
A 4 総合流域防災事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考	
									R3	R4	R5	R6	R7					
1-A4-1	総合治水	一般	香川県	直接	—	香川東部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画更新	東かがわ市ほか							8	8	100%	
1-A4-2	総合治水	一般	香川県	直接	—	香川土器川圏域総合流域防災事業	長寿命化計画更新	丸亀市ほか							9	9	100%	
1-A4-3	総合治水	一般	香川県	直接	—	香川西部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画更新	観音寺市ほか							4	4	100%	
小計(総合流域防災事業)														21	21	100%		
合計														4,075	3,458	85%		

C 効果促進事業 (該当なし)				直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象						R3	R4	R5	R6	R7				
合計												0	0				

要素事業の事業進捗  
**【概ね計画通り進捗】**  
 ・進捗が遅れている事業もあるが、概ね計画通り進捗している。

**2. 今後の方針**  
**【継続】**  
 ・県内には土石流の恐れのある土砂災害警戒区域内に、人家が5戸以上あるなど、対策が急がれる溪流が1,713箇所ある。そのうち整備済みの溪流は417箇所、整備率にして約24%と低い状態にあることから、引き続き整備を進める必要がある。今後も保全人家戸数や要配慮者施設等の有無を考慮した重要度や緊急度を総合的に判断し、計画的な整備に取り組む。  
 ・引き続き計画目標通りの予算確保に努める。


## 事後評価書参考資料

### ■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）

河川砂防課

# 位置図

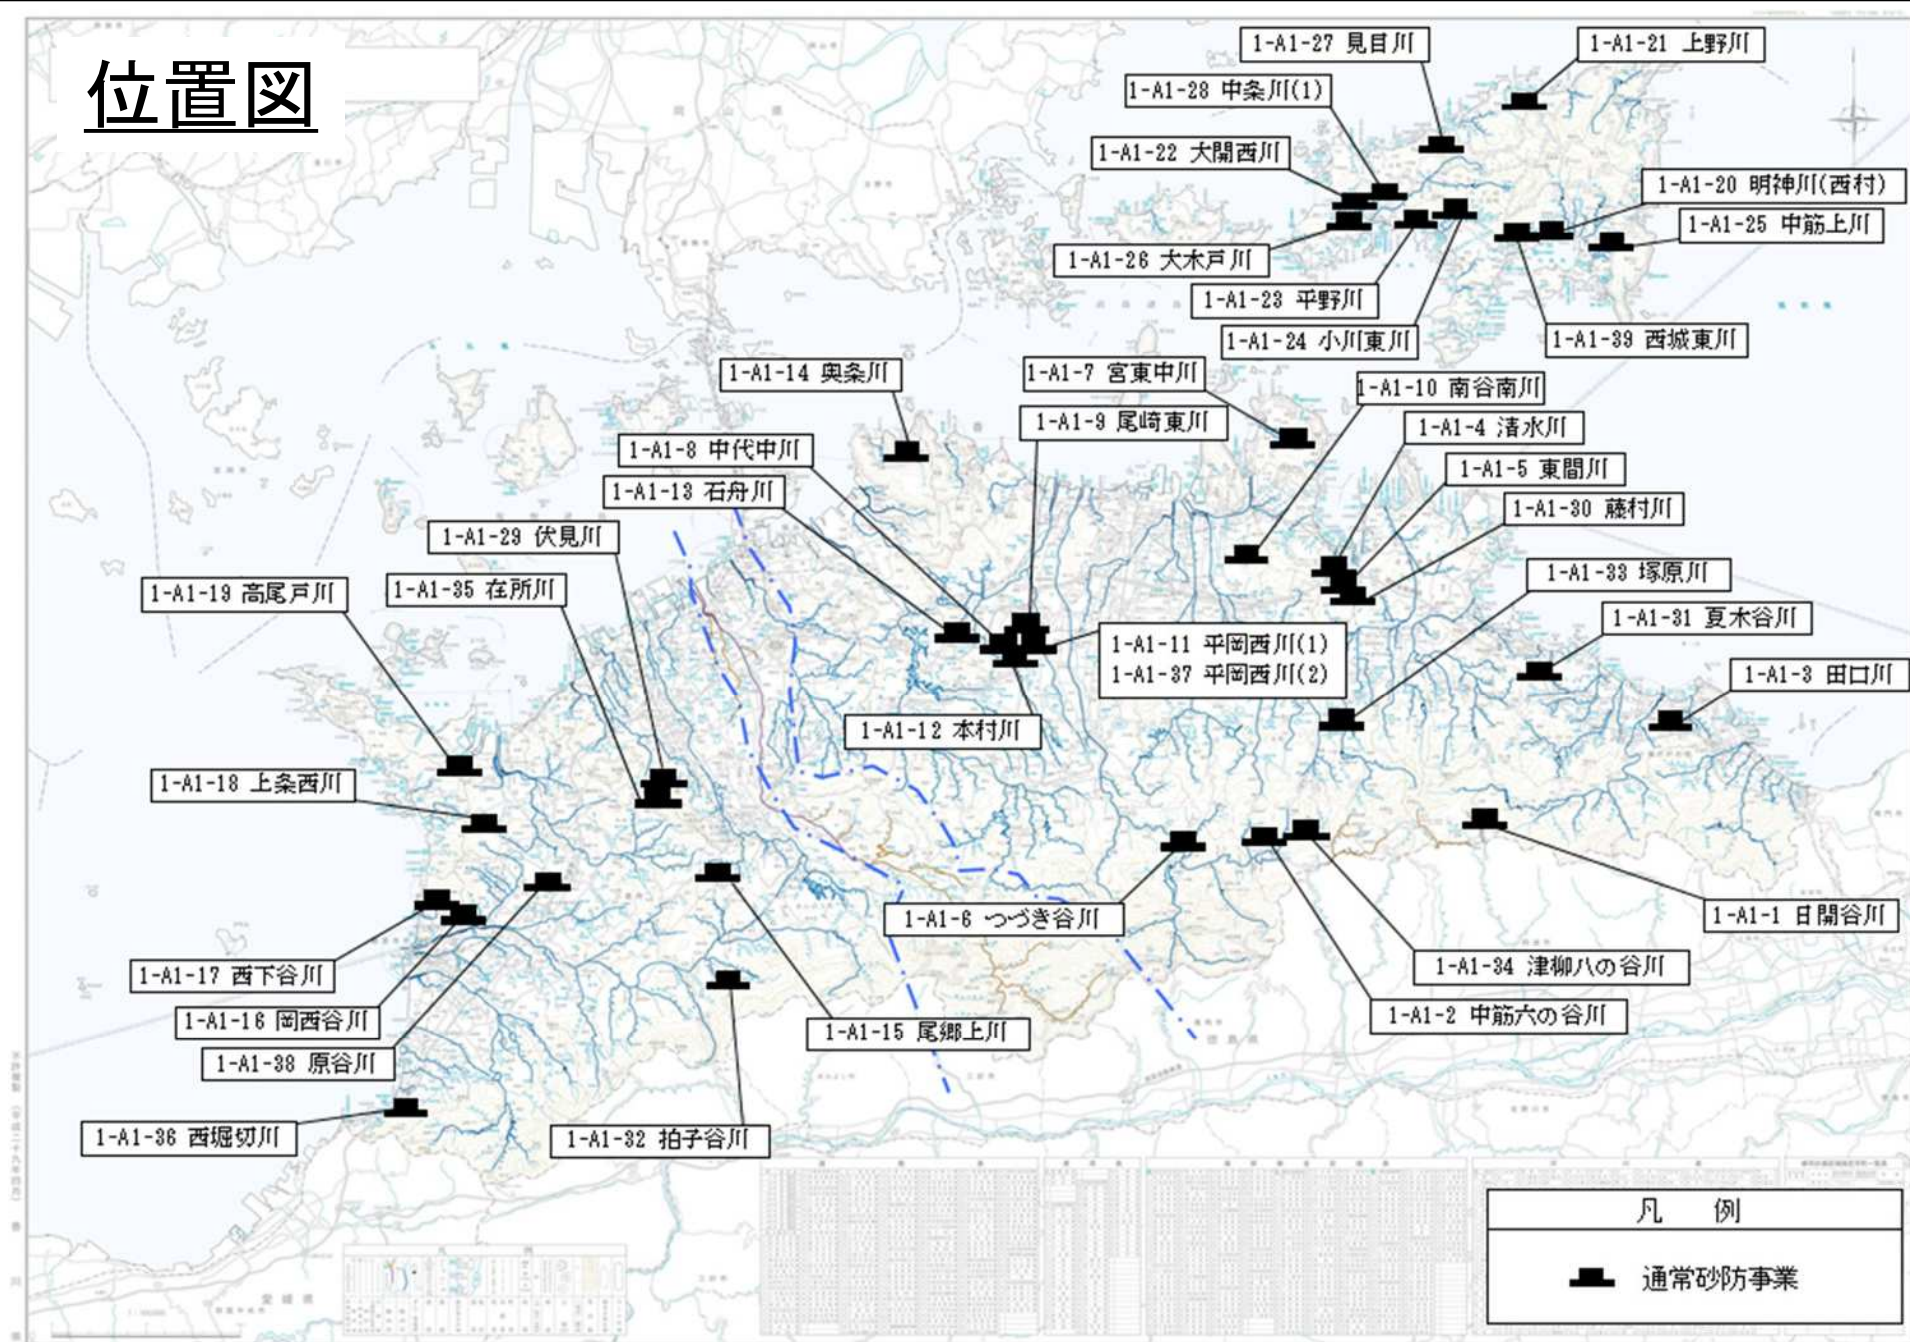

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用した。(許可番号 平21四使、第24号)

# 事業概要

## ① 砂防事業 (39箇所)



田口川(東かがわ市)



大開西川(小豆郡土庄町)

## ② 総合流域防災事業 (長寿命化計画 施設点検)



鎌谷川堰堤(三豊市)



海老済川堰堤(観音寺市)


# 事業概要

	全体数	今回事業内容			計画完了後 整備完了数
		事業内容	事業着手数	完了数	
砂防事業	1,713溪流	砂防堰堤等	39溪流 (39溪流)	9溪流 (8溪流)	418溪流 (417溪流)

上段 : 計画数量  
下段( ): 実施数量

# 事業概要

## 砂防事業 小川東川(小豆島町)

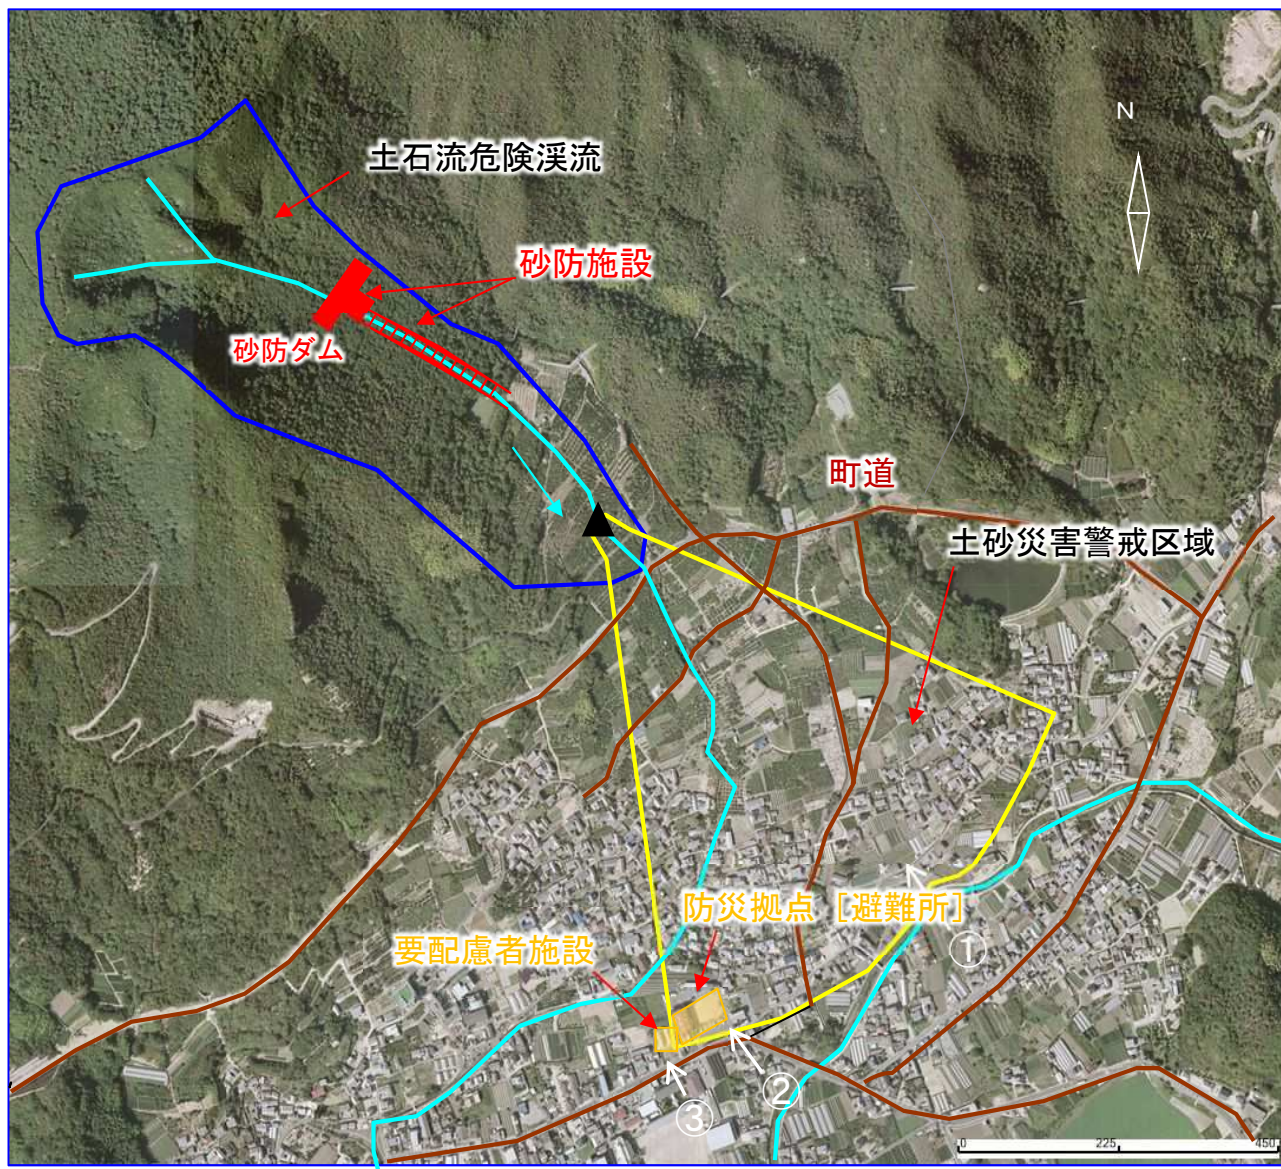

①全景

