

■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

坂出市における防災・減災対策の推進
(防災・安全)

計画の名称	1 坂出市における防災・減災対策の推進（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）	交付対象	坂出市
計画の目標			

・南海トラフ地震又はその他の大規模地震が想定されている地域における津波等による背後地の浸水面積の低減。

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった

・護岸の改良工事を行うことで、南海トラフ地震又はその他大規模地震が想定されている津波等による背後地の浸水面積の低減について進捗が図れた。

計画の成果目標（定量的指標）	・護岸等の整備を実施し、津波等による背後地の浸水想定面積を235ha（R3年度）から0ha（R7年度）に減少させる。		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値					達成率	備考					
	当初現況値	中間目標値	最終目標値									
	(R3当初)	(R5末)	(R7末)									
1. 津波等による背後地の浸水想定面積の低減 (背後地浸水想定面積) = (整備地区における津波等による浸水想定面積) - (護岸等の整備により防護が完了した面積)	目標値: 235 ha	104 ha	0 ha			12%						
	達成値: 235 ha	207 ha	207 ha									
全体事業費	合計 (A+B+C)	780百万円	A	780百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	72%
実施事業費	合計 (A+B+C)	560百万円	A	560百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%		

交付対象事業																	
A 1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				
A09-001	海岸	一般	坂出市	直接	坂出市	坂出地区海岸津波等対策整備事業	護岸等 185m	坂出市						100	100	100%	
A09-002	海岸	一般	坂出市	直接	坂出市	西ふ頭・西運河地区海岸津波等対策整備事業	護岸等 609m	坂出市						680	460	68%	
									合計					780	560	72%	

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				

その他関連する事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考
									R3	R4	R5	R6	R7				
	砂防	一般	香川県	直接	-												
									合計								

要素事業の事業進捗												
概ね計画通り進捗												
・当初想定していた事業費よりも大きくなり、進捗が遅れているところもあるが、概ね計画通り進捗している。												


2. 今後の方針												
継続												
・地震津波等対策を引き続き実施し、浸水面積の低減を図る。												

■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

坂出市における防災・減災対策の推進
(防災・安全)

坂出市 建設経済部 港湾課


位置図

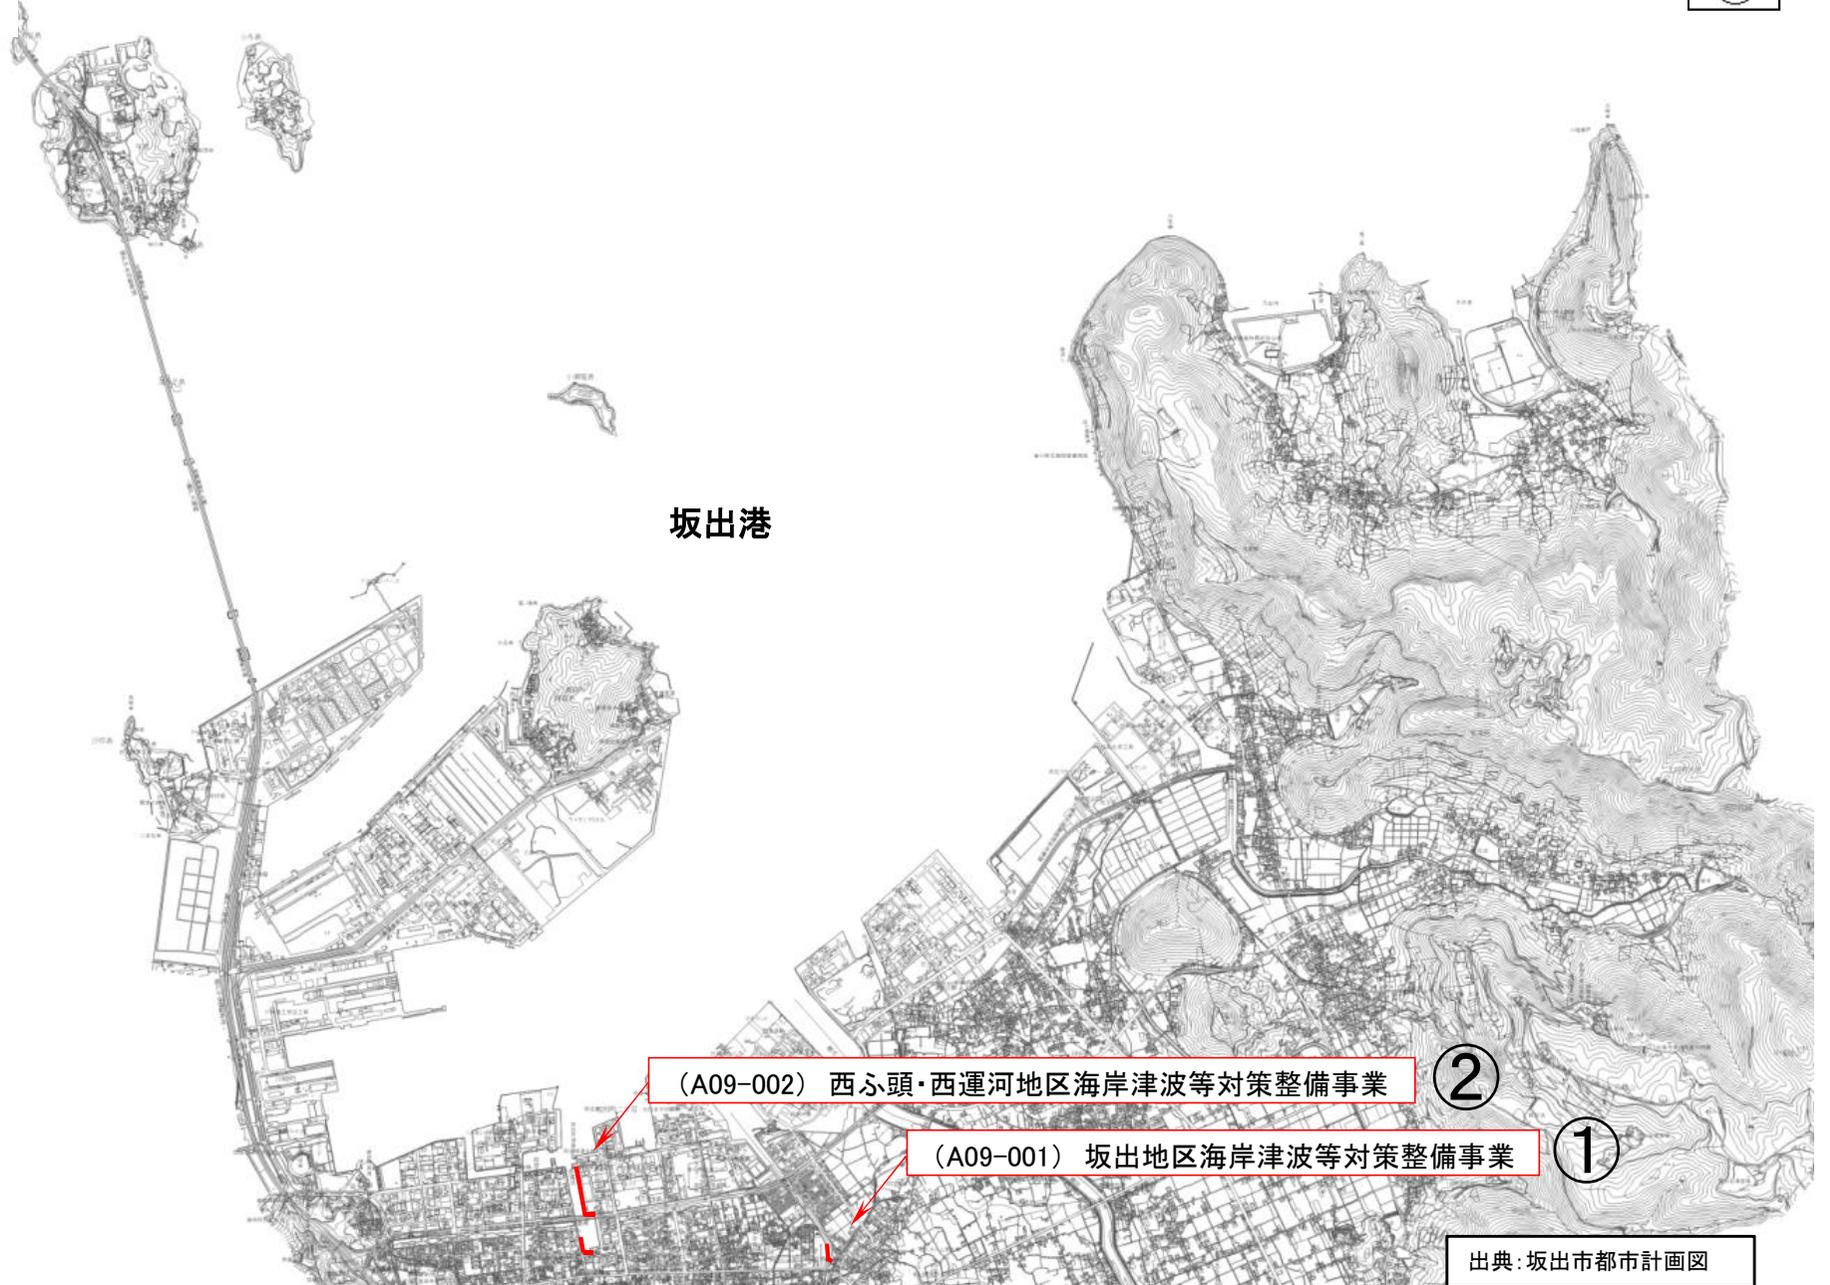

事業概要

①坂出地区海岸津波等対策整備事業

標準断面図

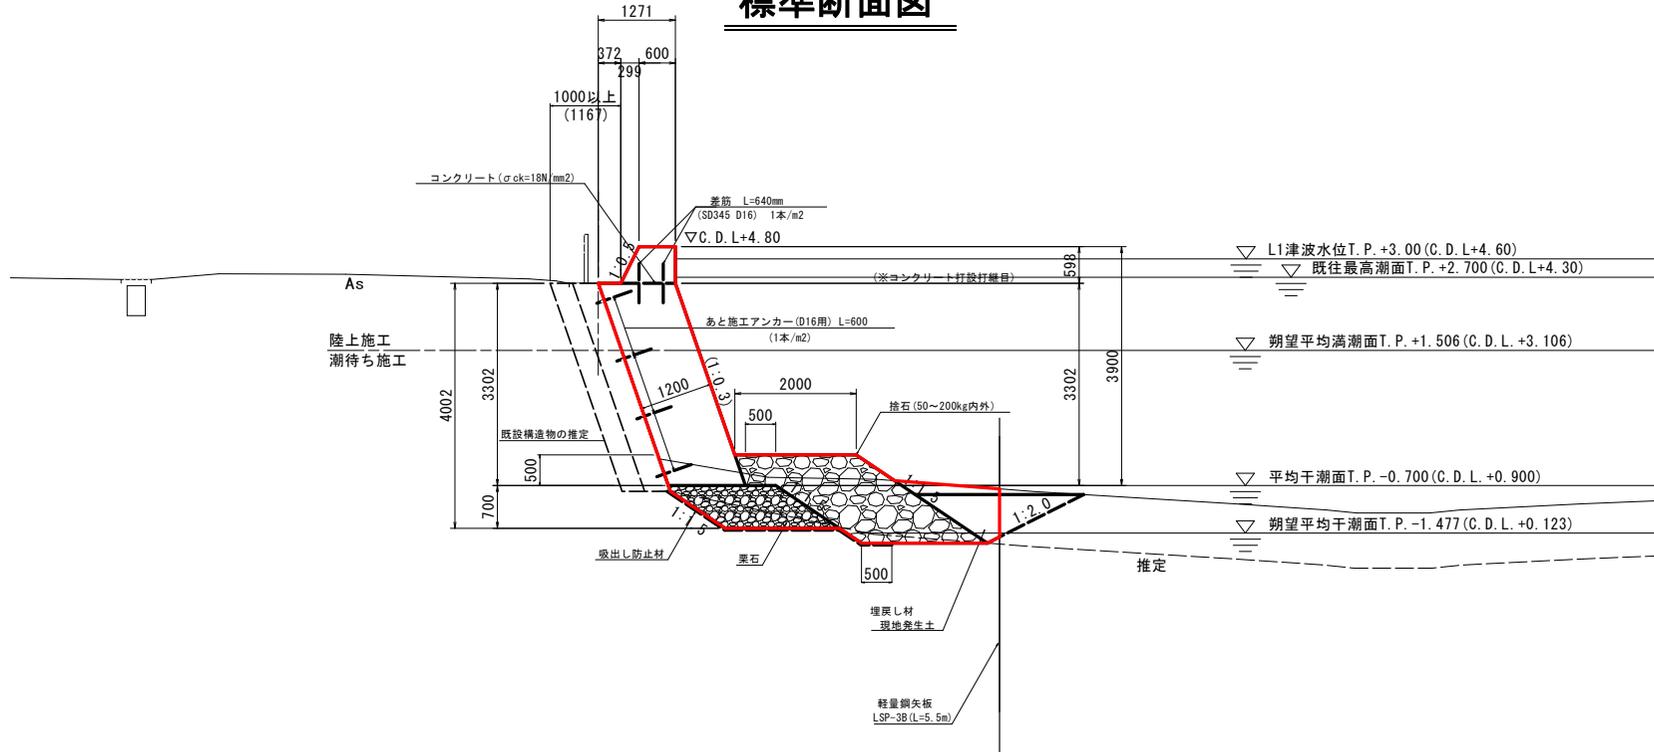


整備後



事業概要

②西ふ頭・西運河地区海岸津波等対策整備事業

標準断面図

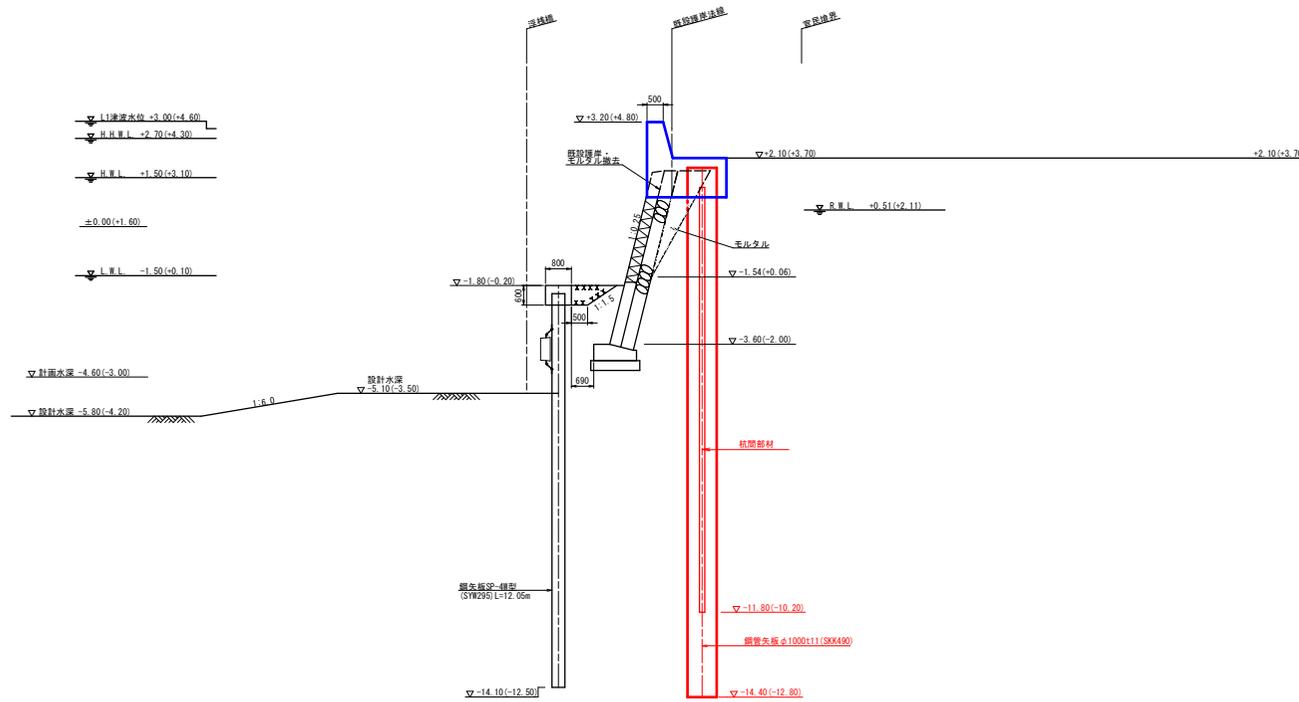

整備中



防護面積位置図

防護面積 (CADIによる求積)
A=2,071,500m² (207ha)

防護面積 (CADIによる求積)
A=1,243,365m² (124ha)

西小頭・西運河地区

凡例

	整備済み箇所(上部工除く)
	R8d以降整備予定箇所

未完了箇所図



x: 未完了箇所
