

■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

山田地区  
都市構造再編集中支援事業

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和7年11月7日

計画の名称	山田地区都市構造再編集中支援事業		
計画の期間	令和元年度 ～ 令和5年度（5年間）	交付対象	香川県高松市
計画の目標			

大目標 本市の目指す「多核型連携コンパクト・エコシティ」の実現のため、中部南地域の生活交流拠点として、地域の日常に欠くことのできない各種サービス機能を提供する集約拠点としての環境づくりを効果的に行うとともに、公共交通サービスの向上を目指し、交流を育み、定住を促す、安全・便宜な魅力あるまちづくりを実現する。

1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があつた

- ・新たに整備された「地域交流センター：川島コミュニティセンター」については、様々なイベントや講座等が開催され、令和6年度の来館者数が21,163人となった。当初の目標には及ばないが、認知度が向上したことにより、令和7年度は26,000人超の利用を見込んでいる。
- ・コミュニティバス利用者数については、令和6年度の利用者数は、4,447人となった。山田地区においては、自家用車を利用する方が多く、当初の目標である6,600人には達しなかった。今後も、自家用車から公共交通機関へのシフトを促進するとともに、コミュニティバスについても、地域住民の方の要望を伺いながら、利便性が高まるように検討する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・新たに整備する地域交流拠点施設の年間利用者数24,000人を目指す
- ・山田地区コミュニティバスの1年あたりの乗降客数6,600人を目指す

定量的指標の定義及び算定式

	定量的指標の現況値及び目標値		達成率	備考
	当初現況値 (H29当初)	最終目標値		
地域交流施設の利用者数	0人	24,000人	88.2%	令和6年度の実績
バス利用者数	6,584人	6,600人	67.4%	令和6年度の実績
全体事業費	合計 (A+B+C) 631.5百万円	A 631.5百万円		進捗率 (事業費ベース) 100%
実施事業費	合計 (A+B+C) 631.5百万円	A 631.5百万円		

交付対象事業

A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									R元	R2	R3	R4	R5				
1-A1-1	都市再生	一般	高松市	直接	高松市	山田地区都市構造再編集中支援事業	道路・公園・高次都市施設・提案事業	高松市						631.5	631.5	100%	
									合計					631.5	631.5	100%	

要素事業の事業進捗

計画通り進捗

2. 今後の方針

完了

## 事後評価書参考資料


### ■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

山田地区

都市構造再編集中支援事業

高松市

# 位置図

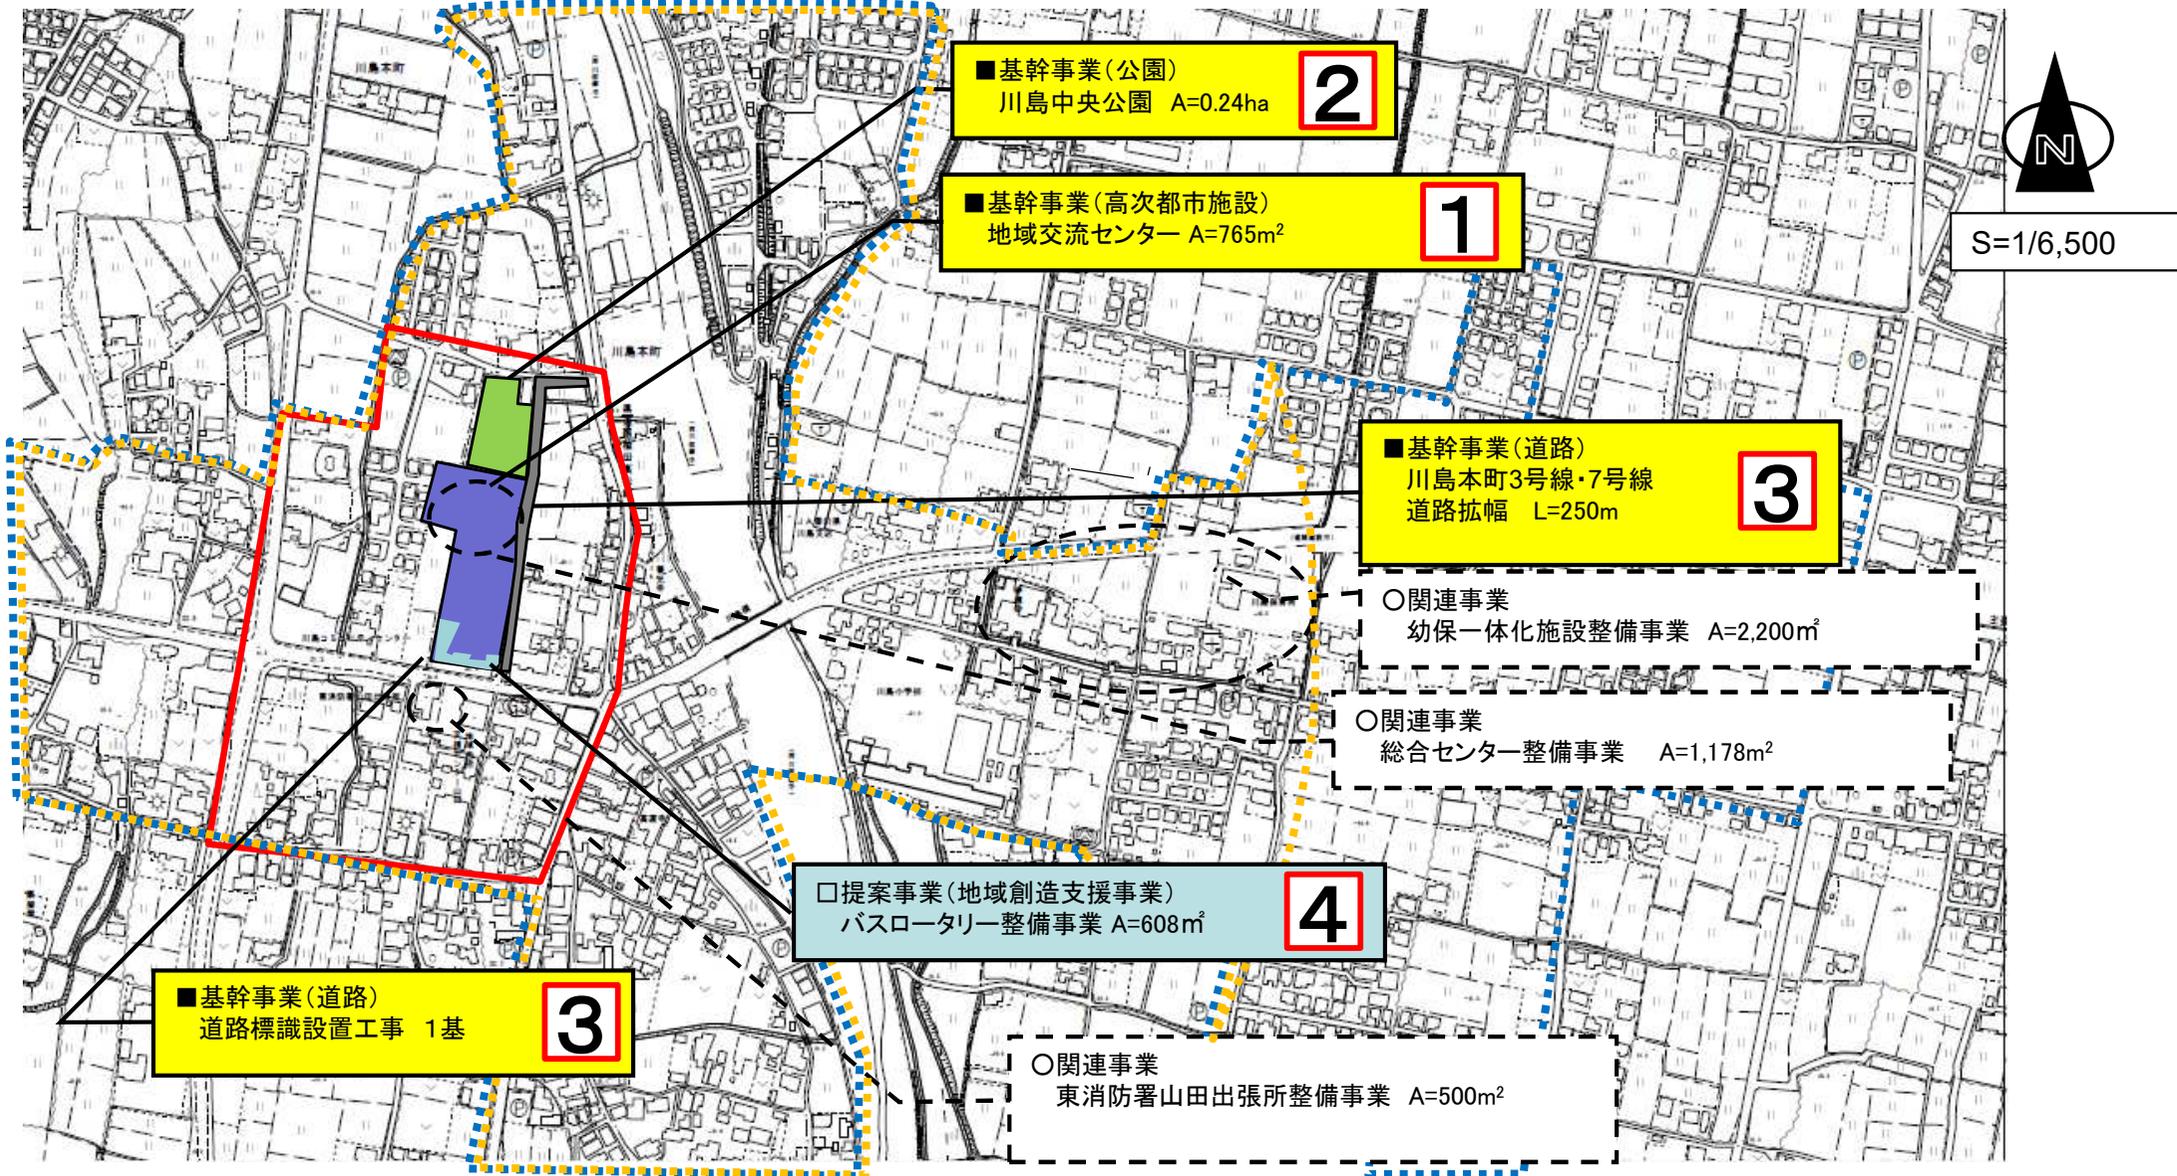

# 事業概要

## ■ 高次都市施設

(地域交流センター: 川島コミュニティセンター)



## ■ 公園

(川島中央公園)



# 事業概要

## ■ 道路

(道路改良・道路標識)



## ■ 提案事業(地域創造支援事業)

(バスロータリー)



# 事業概要

	事業内容	内容	実績	進捗率
基幹事業	高次都市施設 <b>1</b>	地域交流センター整備	A=765m <sup>2</sup>	100%
	公園 <b>2</b>	川島中央公園	A=0.24ha	100%
	道路 <b>3</b>	道路標識設置	1基	100%
		道路改良	L=250m	100%
提案事業	地域創造支援事業 <b>4</b>	バスロータリー	608m <sup>2</sup>	100%
