


② 一般国道438号 飯山・綾歌工区

はんざん あやうた

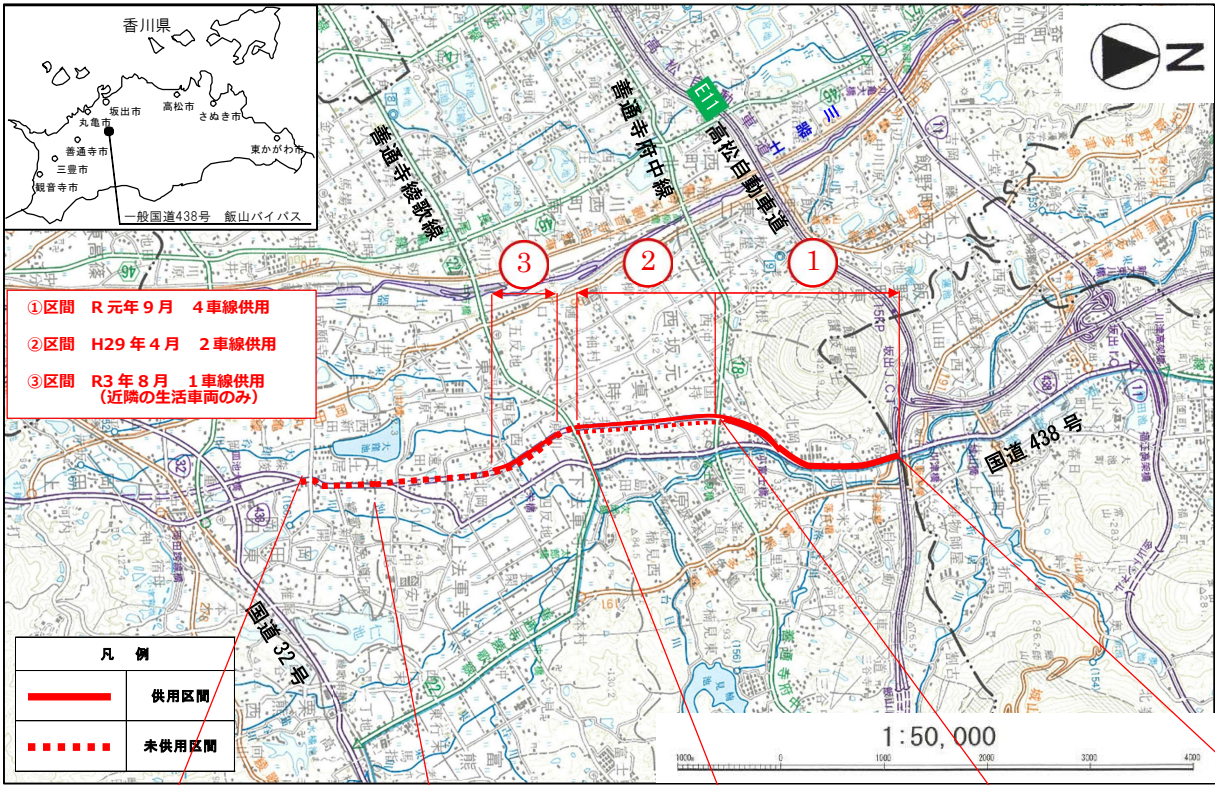

この地図は、測量法第29条に基づき承認「平28情復、第634号」を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したものを、一部転載したものである。

令和8年7月現在

区 間		綾歌工区	飯山工区		
		丸亀市綾歌町岡田東	丸亀市飯山町上法軍寺～県道善通寺綾歌線	県道善通寺綾歌線～県道善通寺府中線	県道善通寺府中線～坂出市川津町
延 長		0.7km	2.0km	1.3km	1.8km
所 在 地		丸亀市綾歌町	坂出市・丸亀市飯山町		
供用開始年度		未定（4車線）	令和3年8月 一部供用開始 （近隣の生活車両のみ） 令和9年度供用開始予定 （全線4車線）	平成29年度供用開始 （暫定2車線） 令和7年度供用開始 （全線4車線）	平成26年度供用開始 （現道拡幅部：4車線） バイパス部：暫定2車線 令和元年9月供用開始 （全線4車線）
測量着手年度 〔着手率（延長比）〕		平成27年度 〔100%〕	平成23年度 〔100%〕	平成15年度 〔100%〕	平成9年度 〔100%〕
設計協議着手年度 〔着手率（延長比）〕		平成27年度 〔100%〕	平成24年度 〔100%〕	平成19年度 〔100%〕	平成9年度 〔100%〕
用地買収着手年度 〔進捗率（面積比）〕		令和元年度 〔67%〕	平成26年度 〔100%〕	平成21年度 〔100%〕	平成10年度 〔100%〕
工事着手年度		—	平成29年度	平成22年度	平成13年度
令和8年度事業内容	測量・設計	埋蔵文化財調査	埋蔵文化財調査	—	—
	用 地	用地買収 物件補償	—	—	—
	工 事	—	改良工事 舗装工事 橋梁工事	—	—

一般国道438号 飯山,綾歌工区 整備状況 (1 / 3)

写真位置図




写真①



写真②



写真③

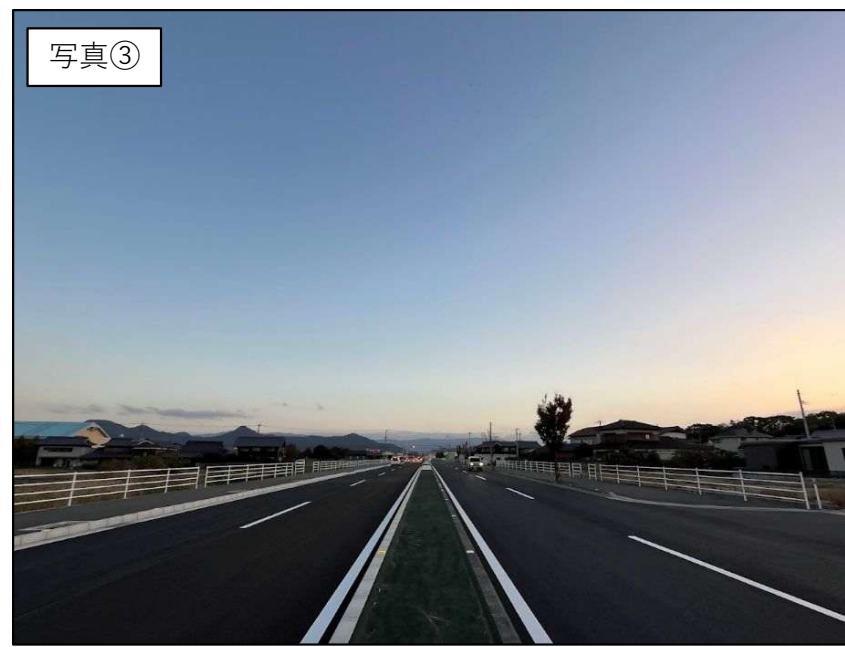

一般国道438号 飯山,綾歌工区 整備状況 (2 / 3)

写真位置図



写真④



写真⑤



写真⑥



一般国道438号 飯山,綾歌工区 整備状況 (3 / 3)

写真位置図



写真⑦



写真⑧



写真⑨

