

令和元年度

第3回 香川県公共事業評価委員会

令和2年2月18日

## 目 次

○ 議事次第	1
○ 委員会委員名簿	2
○ 香川県公共事業評価実施要領	3
○ 香川県公共事業評価委員会設置要綱	6
○ 香川県公共事業評価委員会傍聴要領	8
○ 再評価対象事業位置図	10
○ 再評価対象事業総括表	11
○ 新規事業採択時評価対象事業位置図	13
○ 新規事業採択時評価対象事業総括表	14
○ 事後評価対象計画総括表	15

### 【再評価別添資料】

○ 再評価の視点と対応方針決定の考え方	資料－1
○ 河川総合開発事業 椋川ダム	資料－2
○ 水道水源開発等施設整備事業 椋川ダム	資料－3
○ 再評価実施要領	資料－4

### 【新規事業採択時評価別添資料】

○ 新規事業採択時評価の視点と対応方針決定の考え方	資料－5
○ 事業間連携河川事業 香東川外4河川	資料－6
○ 新規事業採択時評価実施要領	資料－7

# 令和元年度 第3回 香川県公共事業評価委員会

## 議 事 次 第

日 時：令和2年2月18日（火） 13：30～

場 所：香川県広域水道企業団 6階 601会議室

- 1 開 会
  
- 2 香川県公共事業評価実施要領の改正について（報告）
  
- 3 再評価の詳細審議
  - 河川総合開発事業 椋川ダム
  - 水道水源開発等施設整備事業 椋川ダム
  
- 4 新規事業採択時評価の審議
  - 事業間連携河川事業 香東川外4河川
  
- 5 その他
  
- 6 閉 会

香川県公共事業評価委員会委員名簿

(令和2年2月現在)

香川大学 名誉教授	井原 健雄
香川大学 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 副機構長	白木 渡
(株) 人間科学研究所 所長	池田 弘子
(一社) 香川経済同友会 専務理事	大谷 誠一
香川大学創造工学部 教授	角道 弘文
佐藤好美建築工房 主宰	佐藤 好美
香川大学創造工学部 教授	末永 慶寛

以上 7 委員 (敬称略・順不同)

## 香川県公共事業評価実施要領

### 第1 目的

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るとともに、事業計画の効果・効率性や事業効果の発現状況等の検証を行うため、県が事業主体となって実施する公共事業の評価（以下「事業評価」という。）に関して必要な事項を定めることを目的とする。

### 第2 事業評価の対象

対象とする事業は、県が事業主体として実施する事業のうち、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業、局部改良事業等の比較的小規模な事業及び単独事業を除く全ての事業とする。

### 第3 事業評価の区分と対象範囲

事業評価の区分と対象範囲は、以下のとおりとする。

なお、以下に掲げる評価を実施する事業以外の事業についても、国の定める要領及び要綱等に準じ、適宜、適切な時期に評価を実施するものとする。

#### 1 新規事業採択時評価

新規事業採択時評価を実施する事業は、以下のとおりとする。

(1) 事業費を予算化しようとする事業

(2) 準備・計画に要する費用を予算化しようとする事業

#### 2 再評価

再評価を実施する事業は、以下のとおりとする。

なお、再評価を実施しようとする年度に事業が完了又は既に主要な工事を完了している事業については、対象事業から除くことができるものとする。

(1) 事業採択後5年目で未着工の事業

(2) 事業採択後10年目（ただし、補助事業は5年目）で継続中の事業

(3) 再評価実施後5年間が経過している事業

(4) 上記以外の事業で、再評価の実施の必要が生じた事業

#### 3 事後評価

事後評価を実施する事業及び整備計画は、以下のとおりとする。

(1) 事業完了後一定期間（5年以内）が経過した事業で、県が事後評価を行う必要があると判断する事業

(2) 整備計画終了後

#### 4 その他

上記1、2及び3以外の評価のうち、社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により事業評価の実施の必要が生じた事業

### 第4 事業評価の実施及び結果等の公表

#### 1 事業評価の実施時期

① 第3の1の事業については、当該予算に係る年度の前年度末までに実施する。

② 第3の2（1）の事業については、事業採択後5年目の年度末までに実施する。

③ 第3の2（2）の事業については、事業採択後10年目（ただし、補助事業は5年目）の年度末までに実施する。

④ 第3の2（3）の事業については、再評価実施時から5年間が経過後の年度末までに実施する。

⑤ 第3の3（1）の事業については、事後評価の対象となる年の年度末までに実施する。

⑥ 第3の3（2）の整備計画については、計画期間の終了後又は計画期間の最終年度中に実施する。

#### 2 評価結果、対応方針等の公表

評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯等とともに公表するものとする。

### 第5 事業評価の手法

事業評価にあたっては、対象事業の特性に応じて評価を行う際に整理すべき指標及び対応方針を決定する際の判断基準等（以下「評価手法」という。）について、適宜設定するものとする。

なお、国の定める要領及び要綱等に規定のある事業の評価を実施する場合は、国の定める要領及び要綱等に基づいた評価手法に準ずるものとする。

### 第6 対応方針の決定

知事は、事業評価の実施に当たり、第三者の意見を求める諮問機関として、香川県公共事業評価委員会を設置し、意見を聴き、その意見をできる限り尊重して、対象事業の対応方針（継続、事業計画の見直し、休止又は中止若しくは改善措置に関する方針等）を決定するものとする。

## 第7 その他

この要領に定めるもののほか、事業評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

### 附則

- 1 この要領は、平成24年8月17日から施行する。
- 2 令和2年2月18日 一部改正

## 香川県公共事業評価委員会設置要綱

### (目的及び設置)

第1条 香川県公共事業評価実施要領に基づき、専門的な見地からの意見を求めるため、香川県公共事業評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

### (所掌事務)

第2条 委員会は、知事の諮問に応じ、事業評価に係る県公共事業の対応方針について調査審議し、その適否等について知事に答申するものとする。

2 委員会は、調査審議するにあたっては、事業評価に係る県公共事業のうちから特に重要と認める事業を抽出し、当該事業について調査審議のうえ、知事に答申するものとする。

### (組織)

第3条 委員会は委員7人以内で組織する。

2 委員は、地域の実状をよく理解している公平な立場にある有識者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

### (委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置く。

2 委員長は委員が互選し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総括する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

### (会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

### (意見の聴き取り)

第6条 委員会は、調査審議するため必要があると認めるときは、委員以外の人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(特例)

第7条 委員会は、市町（一部事務組合を含む。）から当該市町の実施する事業評価に係る公共事業の対応方針について意見を求められた場合においては、第1条及び第2条の規定にかかわらず、当該対応方針について調査審議し、当該市町に答申するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、香川県土木部技術企画課において行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

付 則

- 1 この要綱は、平成10年11月11日から施行する。
- 2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会は、知事が招集する。
- 3 平成13年12月18日 一部改正
- 4 平成24年8月17日 一部改正
- 5 令和元年7月30日 一部改正

## 香川県公共事業評価委員会傍聴要領

### (この要領の目的)

第1条 この要領は、「審議会等の会議の公開に関する指針(平成10年3月30日策定)」(以下「指針」という。)に基づき、香川県公共事業評価委員会の会議(以下「会議」という。)を公開する場合における当該会議の運営上必要な事項を定めることを目的とする。

### (傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は一般傍聴席と報道関係者席とに分ける。

2 一般傍聴席は10席とする。ただし、次条第3項ただし書の場合はこの限りでない。

### (傍聴の申込み、受付)

第3条 一般傍聴席で会議を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻30分前から開催時刻までの間に、関係の係員に申し出て、備え付けの傍聴受付簿に住所及び氏名を記載し、傍聴の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みの受付は、次条に掲げる者を除き、先着順で行うものとする。

3 一般傍聴席で会議を傍聴できる者は、傍聴受付簿に記載した先着10名とする。ただし、会議の議長が、特に必要があると認めるときは、会議の会場のスペース等を勘案のうえ、一般傍聴席の数を増加し、当該増加席数に応じ、次順位者から傍聴を認めることができるものとする。

4 傍聴人は、会議の議長の指示に従い、会議の会場に入場しなければならない。

### (傍聴席へ入場できない者)

第4条 次に掲げる者は、会議の会場に入場することができない。

- 一 酒気を帯びていると認められる者
- 二 異様な服装をしている者
- 三 きょう器その他危険物と認められる物品を携帯し又は獣類を連れた者
- 四 かさ、のぼり、標識、びら、看板、その他これらに類するものを携帯した者
- 五 その他審議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

### (傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければいけない。

- 一 拍手その他公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等審議を妨害しないこと。
- 二 帽子、外とうの類を着用しないこと。
- 三 飲食物を持ち込んで飲食しないこと。
- 四 不作法な姿勢をしないこと。

- 五 所定の席にて傍聴を行うこと。
- 六 会議の議長の許可なく、会議の様態を撮影し、録音しないこと。
- 七 その他秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
- 八 指針第3項ただし書に基づき、会議が非公開とされた場合には、会議の議長の指示に従い、速やかに退場すること。

(会場の秩序維持)

第6条 傍聴人において前条の規定を守らない者があるときは、会議の議長は、これを注意し、なお守らないときは退場を命じることができる。

附 則

- 1 この要領は、平成19年11月1日から施行する。
- 2 この要領は、平成24年8月17日から施行する。


# 令和元年度 事業評価【再評価】対象事業位置図

○数字は評価対象番号

赤字: 現地調査及び詳細審議

青字: 詳細審議

- ① 社会資本整備総合交付金事業  
主要地方道 丸亀詫間豊浜線(多度津西工区)
- ② 社会資本整備総合交付金事業  
(都)3・4・8 中央村黒線
- ③ 農山漁村地域整備交付金事業  
森林管理道 琴南財田線
- ④ 河川総合開発事業  
椋川ダム
- ⑤ 水道水源開発等施設整備事業  
椋川ダム

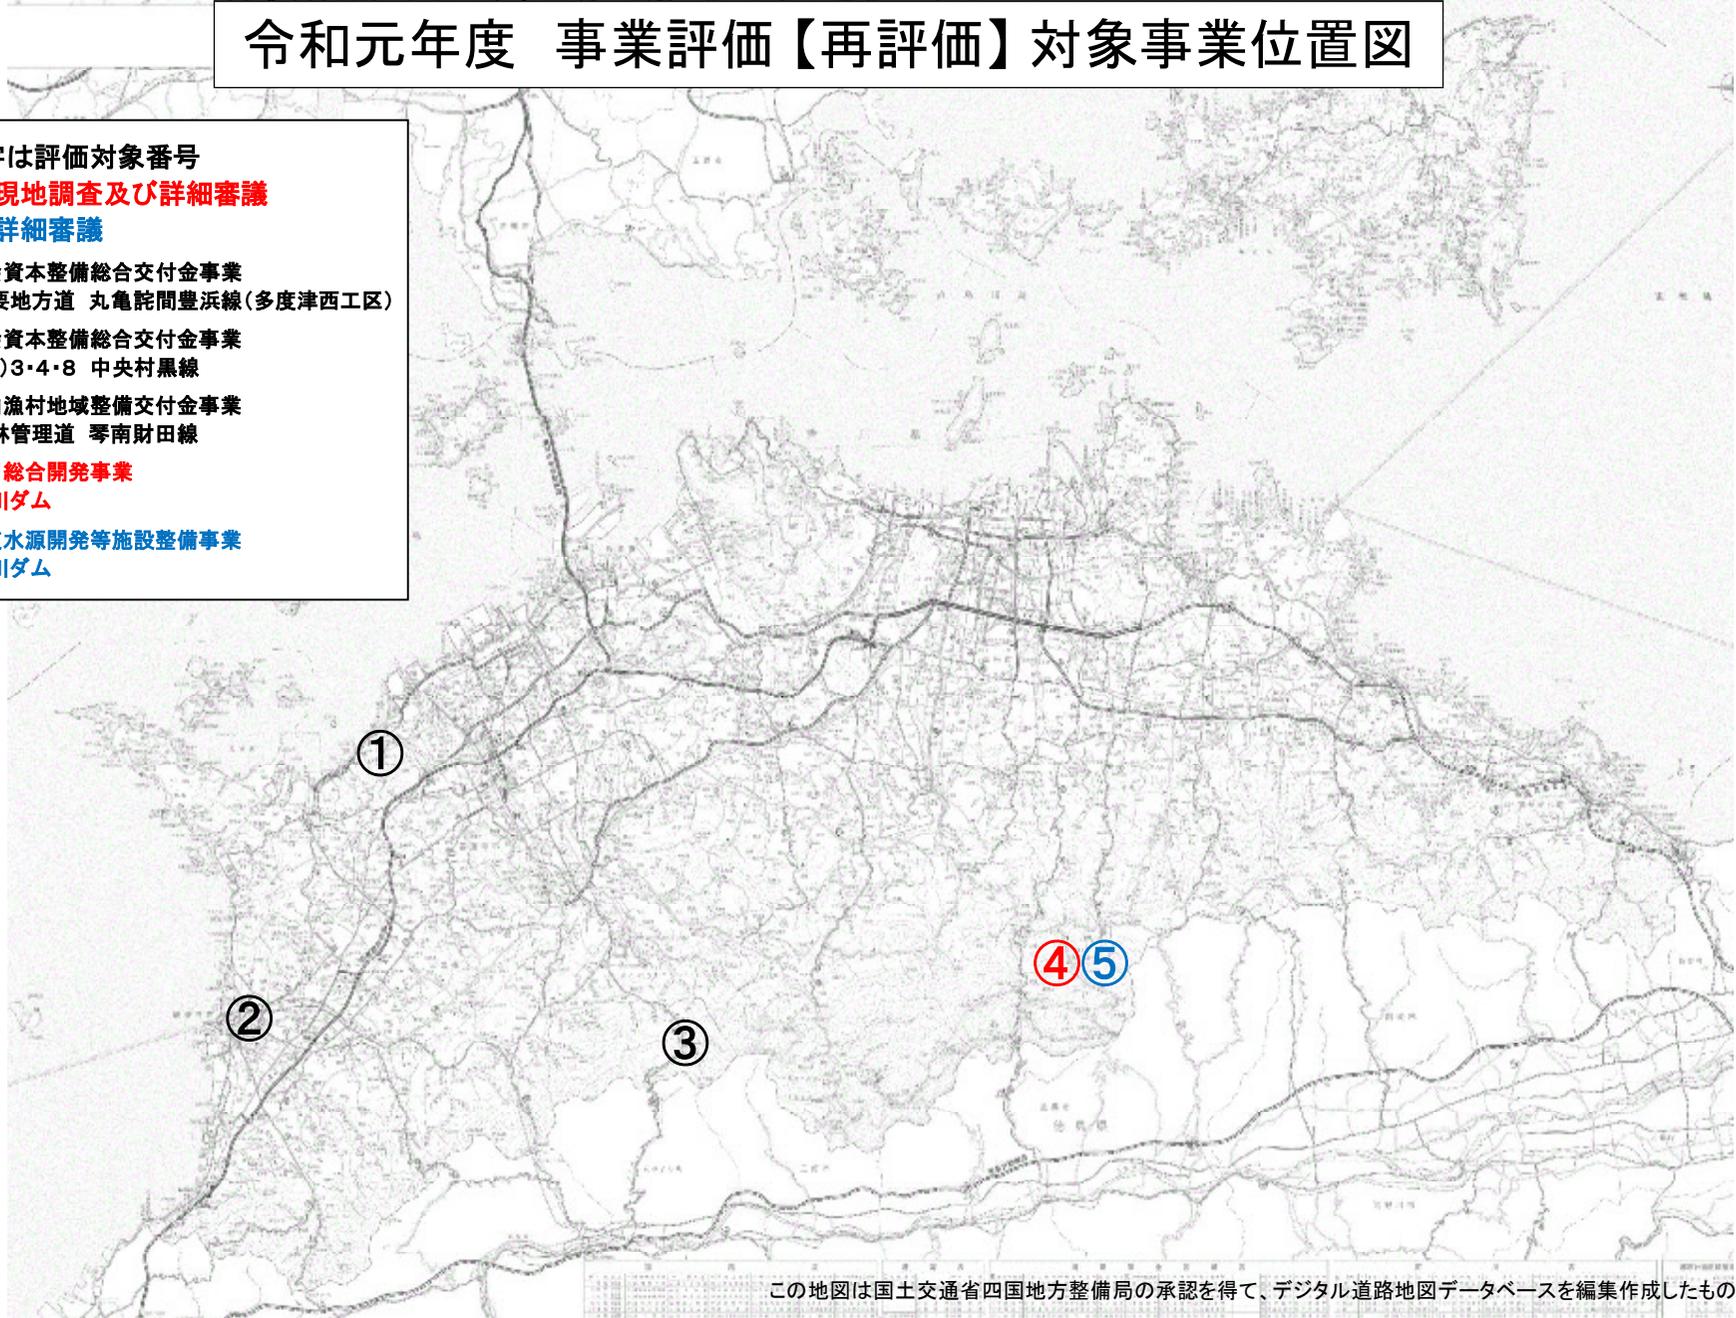

この地図は国土交通省四国地方整備局の承認を得て、デジタル道路地図データベースを編集作成したものである

令和元年度 事業評価【再評価】対象事業総括表

令和2年2月現在

評価対象番号	事業名	道路・河川名等	事業主体	工事箇所	着手年度	事業完了予定年度	再評価基準		対応方針(案)	前回抽出の内容※	摘要
							年数	区分			
1	社会資本整備総合交付金事業	主要地方道丸亀詫間豊浜線(多度津西工区)	香川県	多度津町	2000年(H12)	2021年(R3)	再評価後5年	D	継続	—	H26再評価
2	社会資本整備総合交付金事業	(都)3・4・8中央村黒線	香川県	観音寺市	2002年(H14)	2020年(R2)	再評価後5年	D	継続	—	H26再評価
3	農山漁村地域整備交付金事業	森林管理道琴南財田線	香川県	三豊市・まんのう町	1990年(H2)	2030年(R12)	再評価後5年	D	継続	●	H26再評価
4	河川総合開発事業	椋川ダム	香川県	高松市	1996年(H8)	2021年(R3)	事業進捗による計画の見直し	E	継続	●	H28再評価
5	水道水源開発等施設整備事業	椋川ダム	香川県広域水道企業団	高松市	1996年(H8)	2021年(R3)	事業進捗による計画の見直し	E	継続	●	H28再評価
<b>総計 5事業</b>											

■対応方針(案) **継続 5事業**

※●:現場調査+詳細審議

※○:詳細審議

■:現地調査+詳細審議

□:詳細審議

区 分

A:事業採択後、一定期間経過後未着工の事業

B:事業採択後、長期間が経過している事業(事業採択後5年目<sup>※1)</sup>の年度末までに実施)

C:事業採択前の準備・計画段階で一定期間が経過している事業

D:再評価実施後、一定期間が経過している事業(再評価実施時から5年後の年度末までに実施)

E:その他(社会経済情勢の急激な変化等により再評価の実施の必要が生じた事業)

※1:国が定める再評価実施要領に基づく再評価対象事業以外の事業については、事業採択後10年目の年度末までに実施。

令和元年度 事業評価【再評価】対象事業総括表(詳細)

令和2年2月現在

評価対象番号	事業名	道路・河川名等	事業主体	工事箇所	着手年度	事業完了予定年度	総事業費(百万円)	30年度まで執行事業費(百万円)	進捗率	残事業費(百万円)	事業の必要性等	事業が長期化している理由	再評価基準		対応方針(案)	摘要
													年数	区分		
1	社会資本整備総合交付金事業	主要地方道丸亀詫間豊浜線(多度津西工区)	香川県	多度津町	2000年(H12)	2021年(R3)	9,000	6,871	工事 69% (工事費ベース) 用地 100% (面積ベース)	2,129	中西讃地域の臨海部を結ぶ主要幹線道路である「さぬき浜街道」の一部であり、交通の円滑化を図り、周辺地域の利便性の向上と産業や観光の振興に寄与するとともに、災害時における緊急輸送道路としても重要な道路である。	整備区間が長く、事業完了までに多額の費用と期間を要するため、事業が長期に及んでいる。	再評価後5年	D	継続	H26再評価
2	社会資本整備総合交付金事業	(都)3・4・8中央村黒線	香川県	観音寺市	2002年(H14)	2020年(R2)	4,147	3,838	工事 74% (工事費ベース) 用地 96% (面積ベース)	309	高齢ドライバーが加害者となり、歩行中の子供が巻き込まれる痛ましい事故が全国的に問題となっていること等から、歩道未整備箇所での整備は交通弱者を守るために必要な対策である。また、地域の交通社会における安全・安心の確保に向け、未改修区間についても、地域住民は早期の事業完了を望んでいる。	当初、西から500mについて事業認可を行い、平成25年度で完了する予定であったが、市内の内環状道路として周辺機能等の向上による市内の交通流の円滑化を事業効果として発現させるため、東側の未整備区間を一体的に整備することとし、平成26年1月に事業計画、事業期間を延伸したことによる。	再評価後5年	D	継続	H26再評価
3	農山漁村地域整備交付金事業	森林管理道琴南財田線	香川県	三豊市・まんのう町	1990年(H2)	2030年(R12)	10,675	9,317	工事 87% (工事費ベース)	1,358	山地災害防止や水源かん養等の多様な公益的機能を持つ森林の適正な整備・保全を図るとともに、収穫期を迎える人工林の搬出間伐などの木材生産を効率的に推進する上で、骨格的な基盤施設として整備する必要がある。	整備区間が長く、事業完了までに多額の費用と期間を要するため、事業が長期に及んでいる。	再評価後5年	D	継続	H26再評価
4	河川総合開発事業	栴川ダム	香川県	高松市	1996年(H8)	2021年(R3)	46,000	33,702	全体事業 73% (事業費ベース) 付替道路工事 97% (延長ベース) ダム本体工事 60% (工事費ベース) 用地 100% (面積ベース)	12,298	下流の香東川沿川では、過去に度重なる洪水被害や濁水被害を受けており、早期にダムの洪水調節による治水対策及び水源確保が必要である。	ダム事業は事業規模が大きく、事業完了までに多額の費用と期間を要するため、事業が長期に及んでいる。	事業進捗による計画の見直し	E	継続	H28再評価
5	水道水源開発等施設整備事業	栴川ダム	香川県広域水道企業団	高松市	1996年(H8)	2021年(R3)	7,406 (46,000)	5,426 (33,702)	73% (負担金ベース)	1,980 (12,298)	香川用水を水源とする旧香川県水道用水供給事業への依存度が全体の60%を占めているが、近年香川用水の濁水が頻繁に発生しており、安定給水のためには自己処理水源を充実する必要がある。	ダム事業は事業規模が大きく、事業完了までに多額の費用と期間を要するため、事業が長期に及んでいる。	事業進捗による計画の見直し	E	継続	H28再評価
<b>総計 5事業</b>																

■対応方針(案) 継続 5事業

□ : 現地調査+詳細審議  
□ : 詳細審議

区分

- A: 事業採択後、一定期間経過後未着工の事業
- B: 事業採択後、長期間が経過している事業(事業採択後5年目<sup>※1)</sup>の年度末までに実施)
- C: 事業採択前の準備・計画段階で一定期間が経過している事業
- D: 再評価実施後、一定期間が経過している事業(再評価実施時から5年後の年度末までに実施)
- E: その他(社会経済情勢の急激な変化等により再評価の実施の必要が生じた事業)

※1: 国が定める再評価実施要領に基づく再評価対象事業以外の事業については、事業採択後10年目の年度末までに実施。

# 令和元年度 事業評価【新規事業採択時評価】対象事業位置図

○数字は評価対象番号  
①事業間連携河川事業  
香東川外4河川



この地図は国土交通省四国地方整備局の承認を得て、デジタル道路地図データベースを編集作成したものである

令和元年度 事業評価【新規事業採択時評価】対象事業総括表

令和2年2月現在

評価対象番号	事業名	道路・河川名等	事業主体	工事箇所	着手年度	事業完了予定年度	総事業費(百万円)	事業の必要性等	対応方針(案)	摘要
1	事業間連携河川事業	香東川外4河川	香川県	高松市	2020年(R2)	2024年(R6)	1,500	南海トラフの巨大地震により、高松市中心部では甚大な津波浸水被害が想定されることから、早期の地震・津波対策が必要である。	新規採択	
総計 1事業										

# 令和元年度【事後評価】対象計画 総括表

令和2年2月

番号	計画の名称	計画の目標	事業主体	全体事業費 (百万円)	要素事業の概要	事業実施箇所	計画期間		R2以降 継続計画 策定予定	摘要
							着手 年度	完了 年度		
1	社会資本総合整備計画 生活に密着した道路整備による快適なくらしづくり	・香川県内の地域生活を支援する道路整備を行い、 <u>円滑で安全な走行を確保し、生活環境の向上を図る。</u>	香川県 他8市町	4,895	・バイパス 18事業 ・現道拡幅 5事業 ・自歩道・歩道 3事業 ・トイレの改良 1事業 ・駅前広場 1事業 ・効果促進事業 1事業	高松市 他8市町	H27	R元	有	
2	社会資本総合整備計画 総合的な浸水対策の推進(防災・安全)	・集中豪雨の多発や住宅化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、 <u>流域が一体となって総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い県を作るとともに、安全安心な県民生活の確保を図る。</u>	香川県 他6市町	6,779	・河川事業 14河川 ・河川管理施設長寿命化事業 14施設 ・ダム事業 6ダム ・効果促進事業 11事業	県内一円	H27	R元	有	
3	社会資本総合整備計画 総合的な土砂災害対策の推進(防災・安全)	・ <u>人命と財産を守るための砂防施設等の整備(安全・安心の向上)</u>	香川県 他10市町	5,394	・砂防事業 49箇所 ・地すべり対策事業 4箇所 ・急傾斜地崩壊対策事業 6箇所 ・効果促進事業 8事業	県内一円	H27	R元	有	
4	社会資本総合整備計画 活力のある香川の港づくり	・ <u>港湾労働者、港湾利用者のための広場、緑地等の整備を行うことにより、活力ある港づくりを行う。</u>	香川県	978	・シンボル緑地 玉藻地区 A=14,000m <sup>2</sup> ・休息・緩衝緑地 朝日地区 A=7,000m <sup>2</sup> ・レクリエーション・修景緑地 香西地区 A=93,000m <sup>2</sup>	高松市	H27	R元	有	
5	社会資本総合整備計画 安心安全で活力のある香川の港づくり(防災・安全)	・ <u>地域物流と海上交通の拠点となる港湾施設の改良を行うことにより、安心安全で活力のある香川の港づくりを行う。</u>	香川県	2,887	・港湾施設の改良・補修 47施設 ・長寿命化計画策定事業 2事業 ・関連社会資本整備事業 1事業 ・効果促進事業 2事業	高松市 他8市町	H27	R元	有	
6	社会資本総合整備計画 高松市における安心・安全な港づくり(防災・安全)	・ <u>地域の生活に密着した市管理港湾において、港湾施設の改良を行うことにより、安心・安全な利用ができる港づくりを行う。</u>	高松市	242	・防波堤等の改良 L=170m	高松市	H27	R元	有	
7	社会資本総合整備計画 坂出市における港の安全性の向上(防災・安全)	・ <u>港湾施設の改良を実施し、施設の長寿命化を図り、施設の安全性を向上させる。</u>	坂出市	865	・岸壁の改良 4 施設 ・浮きん橋の改良 1 基	坂出市	H27	R元	有	
8	社会資本総合整備計画 安全で安心して利用できる公園づくりの推進	・ <u>県や市が設置する都市公園において、公園施設長寿命化計画が未策定の公園について、計画策定を行い、その計画に基づいた公園施設の改築・更新を実施することにより、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、適切な維持管理を行っていく。</u>	香川県 三豊市	733	・長寿命化計画策定 県管理公園 10箇所 三豊市公園 8箇所 ・施設の改築・更新 県管理公園 8箇所	高松市 他8市町	H27	R元	有	
9	社会資本総合整備計画 みどり豊かで文化を育むまちづくり	・ <u>既存公園施設の長寿命化対策の実施による快適かつ安心して利用できる都市公園づくり及び緑地公園整備の実施による都市緑化の推進を図るとともに、運動公園を整備することにより、市民のスポーツ・レクリエーションの振興を図る。</u>	高松市	1,919	・南部地域運動公園の整備 1箇所 ・公園施設の改築・更新 73箇所 ・街区公園の整備 5箇所	高松市	H27	R元	有	

社会資本総合整備計画等 審議対象 9 計画
